Федеральное агентство воздушного транспорта
(РОСАВИАЦИЯ)
Федеральное государственное унитарное предприятие
**«ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**
(ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»)

# ПРИКАЗ

«5» октября 2021 г. г. Москва № 573-П

## Об утверждении и введении в действие стандарта организации СТО-ГК-0101-015 «Порядок реализации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ» (редакция 02)

В целях регламентирования процедуры взаимодействия структурных подразделений ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» при реализации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить и ввести в действие стандарт организации СТО-ГК-0101-015 «Порядок реализации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ» (редакция 02, прилагается).
2. Первому заместителю (заместителям) генерального директора, директорам по направлениям деятельности, руководителю Аппарата генерального директора, руководителям структурных подразделений непосредственного подчинения генеральному директору принять указанный стандарт к руководству и довести до сведения ответственных работников.
3. Начальнику секретариата Аппарата генерального директора Арзамаскину А.Г. организовать внесение соответствующих изменений в электронную базу локальных актов Предприятия.
4. Начальнику отдела менеджмента качества Зворыкиной Е.А. согласно пункту 1 настоящего приказа организовать внесение изменений в разделы «Регламенты и стандарты» на корпоративном сайте Предприятия.
5. Признать утратившим силу приказ от 18.08.2020 № 659-П «Об утверждении и введении в действие стандарта организации СТО-ГК-0101-015 «Порядок реализации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ».
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя генерального директора Гульченко В.Р.

Генеральный директор И.Н. Моисеенко

**РОСАВИАЦИЯ**
Федеральное государственное унитарное предприятие
**«Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации»**
**(ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»)**

УТВЕРЖДЕН
приказом ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»

от « 5 » октября 2021 года № 573-п

# СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

# СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ СТО-ГК-0101-015

# Порядок реализации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

| | | |
|---|---|---|
| Разработал | Начальник отдела по реализации НИР и ОКР<br>Е.В. Шувалова | Редакция **02** |

Перед использованием данного СТО проверьте его актуальность, сверив с подлинником СТО в электронном виде в разделе «Регламенты и стандарты» на корпоративном портале Предприятия

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Область применения ....3
2. Нормативные ссылки ....3
3. Термины, определения и сокращения ....4
4. Основные положения ....6
5. Порядок взаимодействия и ответственность структурных подразделений Предприятия на этапах реализации НИОКР ....6
5.1. Определение потребностей Предприятия в НИОКР и формирование Перечня тематик НИОКР (Приложение к проекту Плана НИОКР ФГУП «Госкорпорация по ОрВД») на планируемый год, формирование проекта Плана НИОКР и направление на согласование в Росавиацию. ....6
5.2. Формирование и согласование проектов технических заданий на выполнение НИОКР ....8
5.3. Подготовка закупочных процедур на выполнение НИОКР и включение мероприятий в План НИОКР из Перечня тематик НИОКР. ....9
5.4. Подготовка, согласование проекта документации о закупке и заключение договора на выполнение НИОКР ....11
5.5. Контроль и сопровождение исполнения договора на выполнение НИОКР ....12
5.6. Внедрение, организация учета и хранения полученных результатов НИОКР ....15
7. История изменения документа ....17
Приложение А (справочное) Блок-схема основных этапов реализации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для нужд ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» ....18
Приложение Б (справочное) Определение потребностей Предприятия в НИОКР и формирование Перечня тематик НИОКР (Приложение к проекту Плана НИОКР ФГУП «Госкорпорация по ОрВД») на планируемый год, формирование проекта Плана НИОКР и направление на согласование в Росавиацию ....19
Приложение В (справочное) Организация разработки проектов технического задания на выполнение НИОКР ....20
Приложение Г (справочное) Подготовка закупочных процедур на выполнение НИОКР и включение мероприятий в План НИОКР из Перечня тематик НИОКР (начало) ....21
Приложение Г (справочное). Подготовка закупочных процедур на выполнение НИОКР и включение мероприятий в План НИОКР из Перечня тематик НИОКР (окончание) ....22
Приложение Д (справочное). Организация и сопровождение закупочных процедур на выполнение НИОКР (начало) ....23
Приложение Д (справочное). Организация и сопровождение закупочных процедур на выполнение НИОКР (окончание) ....24
Приложение Е (справочное). Контроль выполнения и организация приемки результатов ....25
Приложение Ж (справочное). Внедрение, организация учета и хранения полученных результатов НИОКР ....26
Приложение З (справочное) Типовая форма проекта технического задания и календарного плана выполнения НИОКР ....27
Лист рассылки СТО ....31



Документ создан в электронной форме. № 573-п от 05.10.2021. Исполнитель:Поликарпова А.Н.
Страница 3 из 32. Страница создана: 05.10.2021 11:03

## 1. Область применения

1.1. Настоящий стандарт определяет порядок взаимодействия структурных подразделений ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» при реализации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее – Стандарт).

1.2. Требования настоящего Стандарта распространяются на все структурные подразделения генеральной дирекции ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (далее по тексту – Предприятие).

1.3. Целью деятельности руководителей, специалистов подразделений генеральной дирекции Предприятия, участвующих в реализации НИОКР, является:

получение концепций, стандартов, требований к техническим средствам и процедурам ОрВД, а также предложений по внесению изменений в нормативные правовые документы Российской Федерации путем проведения научных исследований, с конечной целью внедрения новых технологий и сервисов, предусмотренных Глобальным аэронавигационным планом ИКАО.

1.4. При осуществлении деятельности, направленной на реализацию НИОКР, подразделения и работники Предприятия, привлекаемые к участию в ней в соответствии с их компетенцией, установленной распорядительными документами Предприятия и настоящим Стандартом, решают следующие задачи:

проведение комплекса научных исследований в области организации воздушного движения, связи, навигации, наблюдения, аэронавигационной информации (АНИ), направленных на внедрение новых технологий и сервисов для пользователей воздушного пространства, с учетом экономической эффективности от их внедрения;

проведение научно-методического сопровождения пилотных проектов и оценка результатов их внедрения;

проведение анализа текущего состояния внедрения мероприятий единой системы организации воздушного движения Российской Федерации;

определение перспектив развития единой системы организации воздушного движения Российской Федерации, с учетом стандартов и рекомендуемой практики Международной организации гражданской авиации.

## 2. Нормативные ссылки

Настоящий стандарт разработан в соответствии с требованиями следующих нормативных документов. Для датированных ссылок применяется только цитируемое издание. Для ссылок без указания даты применяется последняя версия ссылочного документа (включая любые изменения):

2.1. Федеральный закон от 18 июля 2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

2.2. Межгосударственный стандарт ГОСТ 15.101-98 Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок выполнения научно-исследовательских работ.

2.3. Межгосударственный стандарт ГОСТ 7.32-2017 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.



Документ создан в электронной форме. № 573-п от 05.10.2021. Исполнитель:Поликарпова А.Н.
Страница 4 из 32. Страница создана: 05.10.2021 11:03

2.4. Положение о Научно-техническом совете ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», утвержденное приказом ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» «О совершенствовании деятельности Научно-технического совета ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

2.5. СТО-ГК-0001-017 «Порядок текущего экономического планирования производственно-хозяйственной деятельности ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

2.6. СТО-ГК-0101-003 «Организация договорной работы в генеральной дирекции ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

2.7. СТО-ГК-0101-012 «Организация и ведение претензионно-судебной работы и исполнительного производства в генеральной дирекции ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

2.8. СТО-ГК-0001-084 «Порядок организации закупочной деятельности ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

2.9. СТО-ГК-0101-019 «Положение о Комиссии по приемке научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ при Научно-техническом совете ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

2.10. Положение о закупках товаров, работ, услуг ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

2.11. Инвестиционная программа ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» на 2020-2030 гг.

2.12. Гражданский кодекс Российской Федерации.

2.13. Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».

2.14. Иные нормативно-правовые акты, локальные и нормативные акты и документы Предприятия, регламентирующие деятельность Предприятия.

## 3. Термины, определения и сокращения

***Исполнитель*** – организация, в лице руководителя или уполномоченного лица, действующего на основании устава или доверенности, обязующаяся выполнить работы по договору в соответствии с условиями договора, техническим заданием и календарным планом.

***Комиссия по приемке НИОКР*** – постоянно действующая при Научно-техническом совете ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» комиссия по приемке отчетной документации и принятию решения о дальнейшем внедрении результатов, полученных в ходе выполнения НИОКР, созданная приказом ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

***Ответственное подразделение по направлению деятельности (далее - Курирующее подразделение)*** – структурное подразделение генеральной дирекции Предприятия, инициирующее выполнение работы и осуществляющее организацию формирования и согласования технического задания, а также сопровождение выполнения НИОКР.

***Ответственный куратор / Эксперт по приемке*** – должностное лицо структурного подразделения генеральной дирекции Предприятия, инициирующего выполнение НИОКР, и назначенное ответственным за:

формирование и согласование проекта технического задания на выполнение НИОКР, осуществляющее контроль на этапах подготовки закупочных процедур, согласования проекта договора (документации о закупке) и заключения договора;

организацию контроля исполнения договора и организацию приемки отчетной документации НИОКР в качестве эксперта по приемке.

***Ответственный за размещение в ЕИС*** – работник дирекции ценообразования и обеспечения закупочной деятельности, ответственный за размещение запросов ценовой информации, информации о закупке, заключенном договоре и о его исполнении в единой информационной системе в сфере закупок.

***Руководитель ответственного подразделения по направлению деятельности (далее - Руководитель курирующего подразделения)*** – первый заместитель генерального директора, заместитель генерального директора, главный бухгалтер, руководитель структурного подразделения прямого подчинения генеральному директору.

***Смежное подразделение*** – структурное подразделение, которое участвует в исполнении заключаемого договора.

***Согласующее подразделение*** – структурное подразделение, участвующее в согласовании проекта договора, исполнительных документов по договору.

***Эксперт по договору*** – работник договорного отдела, осуществляющий организацию согласования, в части правовой оценки проекта договора, а также документации о закупке, экспертизы проекта договора на предмет соответствия правилам юридической техники, выполняющий анализ договора относительно существенных условий, выдачу листа согласования, направление договора/документации о закупке на согласование крупной сделки в случае необходимости, а также представление договора на подпись, направляющий в дирекцию ценообразования для размещения информации о закупке, заключенном договоре и о его исполнении в ЕИС.

***Отчет о научно-исследовательской работе*** – документ, который содержит систематизированные данные о научно-исследовательской работе, описывает состояние научно-технической проблемы, процесс, результаты научно-технического исследования.

***Отчет об опытно-конструкторской работе*** – документ, который содержит систематизированные данные об опытно-конструкторской работе, в том числе комплекс работ по разработке конструкторской и технологической документации на опытный образец, по изготовлению и испытаниям опытного (головного) образца изделия (опытной партии), выполняемых для создания (модернизации) продукции.

***ОКР*** – опытно-конструкторская работа.

***План НИОКР*** – План научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

***НТС*** – научно-технический совет ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

***НИР*** – научно-исследовательская работа.

***НИОКР*** – научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа.

***НМЦД*** – начальная максимальная цена договора.

***ЕИС*** – единая информационная система в сфере закупок.

***ТЗ*** – техническое задание на выполнение НИОКР.

***Филиалы*** – структурные подразделения Предприятия.

***ФОИВ*** – Федеральный орган исполнительной власти

## 4. Основные положения

Процедура реализации НИОКР для нужд ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» осуществляется в несколько этапов:

Этап 1. Определение потребностей Предприятия в НИОКР и формирование Перечня тематик НИОКР (Приложение к проекту Плана НИОКР ФГУП «Госкорпорация по ОрВД») на планируемый год, формирование проекта Плана НИОКР и направление на согласование в Росавиацию.

Этап 2. Формирование и согласование проектов технических заданий на выполнение НИОКР.

Этап 3. Подготовка закупочных процедур на выполнение НИОКР и включение мероприятий в План НИОКР из Перечня тематик НИОКР.

Этап 4. Подготовка, согласование проекта документации о закупке и заключение договора на выполнение НИОКР.

Этап 5. Контроль и сопровождение исполнения договора на выполнение НИОКР.

Этап 6. Внедрение, организация учета и хранения полученных результатов НИОКР.

Блок-схема основных этапов реализации НИОКР для нужд ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» приведена в Приложении А к настоящему Стандарту.

## 5. Порядок взаимодействия и ответственность структурных подразделений Предприятия на этапах реализации НИОКР

### 5.1. Определение потребностей Предприятия в НИОКР и формирование Перечня тематик НИОКР (Приложение к проекту Плана НИОКР ФГУП «Госкорпорация по ОрВД») на планируемый год, формирование проекта Плана НИОКР и направление на согласование в Росавиацию.

На первом этапе процедуры реализации НИОКР для нужд ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» проводится определение тематик НИОКР, ориентировочной лимитной стоимости на плановый год и рассмотрение перечня тематик на заседании НТС для включения в Приложение к Плану НИОКР в следующем порядке:

5.1.1. В целях заблаговременной подготовки к процедуре согласования обоснования лимитной стоимости на выполнение НИОКР, курирующему подразделению рекомендуется в срок, не позднее 1 марта года, предшествующего планируемому, определить проект перечня тематик, планируемых к выполнению НИОКР по своему направлению деятельности, на основании потребностей и предложений структурных подразделений генеральной дирекции и филиалов ФГУП

«Госкорпорация по ОрВД», поручений федеральных органов исполнительной власти (далее – ФОИВ), с учетом лимита расходов и наличия мероприятий в [2.11] согласно положениям [2.4] и [2.5] с целью последующего рассмотрения на НТС ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» для принятия решения о целесообразности выполнения и соответствии технической политики в области организации эксплуатации, поддержания и развития системы ОрВД с учетом развития Аэронавигационной системы Российской Федерации.

5.1.2. Ответственный куратор мероприятия заблаговременно формирует и направляет на согласование в адрес дирекции ценообразования и обеспечения закупочной деятельности проект обоснования ориентировочной лимитной стоимости по НИОКР на основании существующих проектов аналогов.

5.1.3. Дирекция ценообразования и обеспечения закупочной деятельности в срок, не превышающий 10 (десять) рабочих дней с даты получения пакета документов, рассматривает и при отсутствии замечаний согласовывает представленное обоснование ориентировочной лимитной стоимости по НИОКР, о чем информирует служебной запиской курирующее подразделение и дирекцию экономики и программ развития.

5.1.4. Ответственный куратор, формирует заявку на включение новой работы в перечень тематик Плана НИОКР на плановый год с приложениями, в порядке предусмотренном [2.5] и направляет в адрес дирекции экономики и программ развития для последующего представления на НТС ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

5.1.5. Дирекция экономики и программ развития в порядке и сроки, предусмотренные [2.5], рассматривает заявку на включение новой работы в перечень тематик НИОКР (приложение к Плану НИОКР) на планируемый год на соответствие лимитам, предусмотренным программными документами, и направляет пакет документов для организации проведения НТС согласно положениям [2.4] и [2.5].

5.1.6. На основании решений, принятых Научно-техническим советом:

- курирующие подразделения в порядке и в сроки, предусмотренные [2.5], формируют заявки в План НИОКР на планируемый год, содержащие новые мероприятия на планируемый и последующие годы, и направляют их в дирекцию экономики и программ развития;

- дирекция экономики и программ развития формирует проект Плана НИОКР с приложением перечня тематик НИОКР на планируемый год с учетом ежегодного лимита финансирования, предусмотренного [2.11], и в сроки, предусмотренные [2.5], направляет на рассмотрение в ФОИВ.

5.1.7. Согласованный ФОИВ План НИОКР утверждается генеральным директором ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» в порядке и в сроки, предусмотренные [2.5].

5.1.8. В целях организации планирования и контроля сроков исполнения мероприятия, ответственный куратор организовывает заполнение сформированного сетевого плана-графика по мероприятиям НИОКР, одобренным на НТС ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», и в соответствии с ч.3.1 ст.3 [2.1], [2.10] предварительно определяет один из следующих способов закупки для НИОКР:

неконкурентный способ закупки НИОКР, путем проведения закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);

конкурентный способ закупки НИОКР, путем проведения торгов.

5.1.9. Блок-схема процедуры определения потребностей Предприятия в НИОКР и формирование Перечня тематик НИОКР (Приложение к проекту Плана НИОКР ФГУП «Госкорпорация по ОрВД») на планируемый год, формирование проекта Плана НИОКР и направление на согласование в Росавиацию приведена в Приложении Б к настоящему Стандарту.

## 5.2. Формирование и согласование проектов технических заданий на выполнение НИОКР

На втором этапе процедуры реализации НИОКР для нужд ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» проводится организация разработки проектов технических заданий на выполнение НИОКР и их согласование с ФОИВ в следующем порядке:

5.2.1. Ответственный куратор организует работу по разработке проекта технического задания и календарного плана выполнения работ, в соответствии с типовой формой (Приложение 3).

При необходимости создания рабочей группы по подготовке проекта Технического задания ответственный куратор готовит соответствующее распоряжение, с указанием сроков формирования проекта технического задания, и организует ее работу.

При необходимости рассмотрения и согласования проекта технического задания со смежными структурными подразделениями генеральной дирекции и рассмотрения филиалами, ответственный куратор направляет соответствующую служебную записку (письмо) с приложением проекта технического задания в адрес директора по смежному направлению деятельности (директора филиала). Срок рассмотрения проекта технического задания не должен превышать 5 (пять) рабочих дней с даты получения служебной записки (письма).

В случае, если для рассмотрения проекта технического задания требуется дополнительное время, смежное подразделение и/или филиал уведомляет курирующее подразделение о причинах невозможности рассмотрения в установленный настоящим Стандартом срок, с указанием срока предоставления предложений и замечаний. Смежные структурные подразделения генеральной дирекции и филиалы рассматривают и представляют замечания и предложения в виде редакционных формулировок к проекту технического задания в части, касающейся своего направления деятельности, в соответствии с их Положениями о дирекции/отделе/группе.

Примечание: Общий суммарный срок формирования проекта технического задания и Календарного плана выполнения работ не должен превышать 60 (шестьдесят) рабочих дней, если иного срока не установлено Директором курирующего подразделения.

5.2.2. Ответственный куратор мероприятия направляет проект технического задания и Календарного плана выполнения работ на согласование с ФОИВ.

5.2.3. Ответственный куратор мероприятия осуществляет контроль и сопровождение согласования проекта технического задания и календарного плана выполнения работ с ФОИВ в целях соблюдения сроков сетевого плана-графика исполнения мероприятий НИОКР.

В случае нарушения сроков, указанных в сетевом план-графике, ответственный куратор мероприятия незамедлительно информирует непосредственного руководителя о факте и причинах нарушения сроков в целях подготовки доклада директору курирующего подразделения и руководителю курирующего подразделения, для последующего принятия решения и выработке мер, направленных на получение согласования проекта технического задания с ФОИВ и последующую корректировку сроков сетевых планов-графиков исполнения мероприятий НИОКР.

5.2.4. В случае поступления от ФОИВ замечаний к проекту технического задания и/или Календарному плану выполнения работ, ответственный куратор устраняет замечания, в срок не превышающий 5 (пять) рабочих дней с даты их поступления, если иного срока не установлено Директором курирующего подразделения.

5.2.5. Блок-схема формирования и согласования проектов технических заданий на выполнение НИОКР приведена в Приложении В к настоящему Стандарту.

### 5.3. Подготовка закупочных процедур на выполнение НИОКР и включение мероприятий в План НИОКР из Перечня тематик НИОКР.

На третьем этапе процедуры реализации НИОКР для нужд ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» проводится определение лимитной стоимости мероприятия для целей включения работы в План НИОКР ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» из Перечня тематик НИОКР, последующее включение заявки в состав Плана закупки ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» и размещение в Единой информационной системе в сфере закупок в следующем порядке:

5.3.1. Ответственный куратор, в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней, с даты получения письма о согласовании проекта технического задания с ФОИВ, организует формирование и направление описания предмета закупки в адрес дирекции ценообразования и обеспечения закупочной деятельности для организации запроса ценовой информации, в соответствии с требованиями [2.8].

5.3.2. Дирекция ценообразования и обеспечения закупочной деятельности на основании, представленного описания предмета закупки, направляет запрос ценовой информации.

5.3.3. Назначенный ответственный исполнитель дирекции ценообразования и обеспечения закупочной деятельности в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с даты окончания подачи ценовой информации, направляет служебную записку с приложением копий полученных ценовых предложений, содержащую заключение о величине лимитной стоимости мероприятия для целей включения в План НИОКР, в адрес курирующего подразделения и дирекции экономики и программ развития.

5.3.4. Ответственный куратор в срок, не превышающий 3 (три) рабочих дня с даты получения от дирекции ценообразования и обеспечения закупочной деятельности служебной записки с приложением копий полученных ценовых предложений, а также содержащей заключение о величине лимитной стоимости

мероприятия для целей включения в План НИОКР, формирует следующий пакет документов, включающий:

- заявку на включение мероприятия в План из Перечня тематик НИОКР по установленной форме;
- проект технического задания, согласованный Росавиацией;
- служебную записку дирекции ЦОЗД о размере лимитной стоимости мероприятия для целей включения мероприятия в План НИОКР из Перечня тематик НИОКР.

Сформированный пакет документов направляется посредством СЭД приложением к служебной записке на имя первого заместителя генерального директора, председателя НТС с предварительным согласованием дирекции экономики и программ развития (в части соответствия лимитам и наличия мероприятия в Перечне тематик НИОКР) о включении мероприятия в План НИОКР из Перечня тематик НИОКР без рассмотрения на заседании Научно-технического совета.

5.3.5. Председатель НТС, после заключения дирекции экономики и программ развития, в части соответствия лимитам и наличия мероприятия в Перечне тематик НИОКР, принимает одно из следующих решений:

о включении работы в План НИОКР без рассмотрения на НТС (упрощенный порядок);

об инициации проведения НТС с целью последующего принятия решения о включении представленной работы в План НИОКР в порядке и сроки, установленные [2.4].

5.3.6. В случае принятия председателем НТС решения о включении новой работы в План НИОКР без рассмотрения на НТС дирекция экономики и программ развития в срок не более 5 рабочих дней посредством СЭД Практика инициирует согласование Изменения в План НИОКР. После утверждения Изменения генеральным директором ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» дирекция экономики и программ развития:

- формирует редакцию Плана НИОКР с учетом внесенного изменения;
- направляет указанную редакцию Плана НИОКР в дирекцию по информационным технологиям для формирования интеграционного файла с лимитами финансирования по мероприятиям и статьям расходов Предприятия и передачи его не позднее 10:00 мск следующего дня в дирекцию ценообразования и обеспечения закупочной деятельности. Дирекция ценообразования и закупочной деятельности не позднее следующего рабочего дня после получения интеграционного файла загружает обновленную информацию о лимитах в Систему ОрВД.Закупки.

5.3.7. В случае принятия председателем НТС решения о рассмотрении заявки на включение новой работы в План НИОКР на заседании НТС, ответственный куратор направляет материалы (представленный пакет документов с резолюцией председателя НТС) в адрес секретаря НТС для организации проведения НТС установленным порядком.

5.3.8. Порядок включения новых работ в План НИОКР, внесения изменений в План НИОКР, а также уточнения сроков реализации мероприятий Плана НИОКР с



Документ создан в электронной форме. № 573-п от 05.10.2021. Исполнитель:Поликарпова А.Н.
Страница 11 из 32. Страница создана: 05.10.2021 11:03

учетом их исполнения в предшествующем году в части касающейся, определены положениями [2.4] и [2.5].

Примечание: Включение новых работ в План НИОКР ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (по отдельным / срочным поручениям ФОИВ) проводится на заседании НТС с предварительным представлением Заявки на включение новой работы в План НИОКР с приложениями, в порядке, предусмотренном положениями [2.4] и [2.5].

5.3.9. Назначенный ответственный исполнитель дирекции ценообразования и обеспечения закупочной деятельности, в срок не превышающий 3 (три) рабочих дня с даты загрузки лимитов финансирования по мероприятию в Систему ОрВД.Закупки, формирует и организовывает процедуру согласования заявки в План закупки в Системе ОрВД.Закупки. Формирование и организация процедуры согласования заявок в План закупки в Системе ОрВД.Закупки проводится в соответствии с [2.8].

5.3.10. По результатам согласования, включения заявки в План закупки в Системе ОрВД.Закупки и последующего размещения в ЕИС, дирекция ценообразования и обеспечения закупочной деятельности, в срок не превышающий 1 (один) рабочий день, информирует куратора о факте размещения Плана закупки в ЕИС.

5.3.11. Ответственный куратор осуществляет контроль формирования, согласования и включения заявки в План закупки в Системе ОрВД.Закупки с последующим размещением в ЕИС и соблюдение сроков, указанных в сетевом плане-графике исполнения мероприятий НИОКР. В случае нарушения сроков, указанных в сетевом плане-графике, незамедлительно информирует непосредственного руководителя о факте и причинах нарушения сроков в целях подготовки доклада директору курирующего подразделения и руководителю инициатора закупки, для последующего принятия решения и выработки мер, направленных на недопущение срыва сроков реализации мероприятия НИОКР.

5.3.12. Блок-схема подготовки закупочных процедур на выполнение НИОКР и включение мероприятий в План НИОКР из Перечня тематик НИОКР приведена в Приложении Г к настоящему Стандарту.

### 5.4. Подготовка, согласование проекта документации о закупке и заключение договора на выполнение НИОКР

На четвертом этапе процедуры реализации НИОКР для нужд ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» проводится процедура подготовки и сопровождения согласования проекта документации о закупке с последующим заключением договора на выполнение НИОКР в следующем порядке:

5.4.1. После получения уведомления от дирекции ценообразования и закупочной деятельности о факте размещения заявки в составе новой редакции Плана закупки ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» в ЕИС, ответственный куратор, в срок не превышающий 5 (пять) рабочих дней, формирует комплект документов о закупке и направляет в адрес дирекции правового обеспечения, договорной работы и имущественных отношений для дальнейшей организации согласования, согласно положениям [2.6].

5.4.2. Порядок и сроки направления, рассмотрения и согласования проекта договора/документации о закупке в структурных подразделениях Предприятия,

определен положениями [2.6] с учетом сроков, установленных сетевым планом-графиком исполнения мероприятий НИОКР (в том числе согласование с ФОИВ, при необходимости такого согласования).

5.4.3. По результатам согласования проводится публикация согласованного комплекта документации в ЕИС, в соответствии с положениями [2.6], [2.8] и [2.10].

5.4.4. Порядок заключения договора на выполнение НИОКР в случае неконкурентного и конкурентного способа закупки определен положениями [2.6] и [2.10].

5.4.5. Ответственный куратор осуществляет: контроль согласования проекта договора/документации о закупке в подразделениях Предприятия, контроль направления на согласование в адрес ФОИВ (при необходимости такого согласования), контроль публикации согласованного комплекта документов в ЕИС, контроль поступления проекта договора от контрагента и его обеспечения, контроль заключения договора, и соблюдение сроков, указанных в сетевом плане-графике исполнения мероприятий НИОКР. В случае нарушения сроков, указанных в сетевом плане-графике, ответственный куратор незамедлительно информирует непосредственного руководителя о факте и причинах нарушения сроков в целях подготовки доклада директору курирующего подразделения и руководителю инициатора закупки, для последующего принятия решения и выработки мер, направленных на недопущение срыва сроков реализации мероприятия НИОКР.

5.4.6. Блок-схема организации и сопровождение закупочных процедур на выполнение НИОКР приведена в Приложении Д к настоящему Стандарту.

## 5.5. Контроль и сопровождение исполнения договора на выполнение НИОКР

На пятом этапе процедуры реализации НИОКР для нужд ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» проводится контроль выполнения и организация приемки результатов выполненных НИОКР в следующем порядке:

5.5.1. Ответственный куратор или ответственный исполнитель подразделения по направлению деятельности, инициирующей данное мероприятие НИОКР, приказом ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» назначается экспертом по приемке выполненных работ по НИОКР в течении 10 рабочих дней с даты заключения договора.

5.5.2. В сроки, установленные договором, исполнитель представляет План-график выполнения работы с описанием промежуточных результатов этапов работ и сроков их выполнения в целях организации контроля хода и качества исполнения заключенного договора Заказчиком.

5.5.3. При наличии необходимости и по согласованию с руководителем подразделения, эксперт по приемке запрашивает информацию о ходе выполнения этапов (подэтапов) работ, отмеченных в представленном исполнителем План-графике, с целью контроля исполнения НИОКР.

5.5.4. Эксперт по приемке в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления отчета о реализации Плана-Графика, рассматривает его и контролирует ход выполнения работ. При наличии рисков срыва сроков получения результатов работ, эксперт по приемке докладывает об этом руководителю подразделения для



Документ создан в электронной форме. № 573-п от 05.10.2021. Исполнитель:Поликарпова А.Н.
Страница 13 из 32. Страница создана: 05.10.2021 11:03

последующей организации работ по выработке решений, направленных на получение результатов работ надлежащего качества, в соответствии с условиями договора.

5.5.5. Представление исполнителем отчетной документации в виде результатов выполненных работ, в соответствии с техническим заданием и календарным планом осуществляется в срок, установленный договором.

Отчетные документы по Договору (по отдельному этапу Договора) должны быть оформлены в соответствии с требованиями [2.3].

Отчетные документы брошюруются и представляются в архивных боксах. На торце архивного бокса должно быть напечатано: номер, дата и наименование проекта, а также обобщенное название содержащихся в нем документов. К каждому боксу прикладывается опись содержащихся документов. Если боксов несколько, также прикладывается общая опись документов с разбивкой по боксам, а боксы нумеруются.

5.5.6. Отдел документационного обеспечения организовывает регистрацию и направление представленной документации в соответствии с положениями [2.6].

5.5.7. Рассмотрение и принятие решения о приемке результатов НИОКР (отдельного этапа НИОКР), внедрении или невозможности использования полученных результатов проводится Комиссией по приемке НИОКР при Научно-техническом совете ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

5.5.8. Порядок рассмотрения отчетной документации и организация работы Комиссии по приемке НИОКР при Научно-техническом совете, определены положениями [2.9].

5.5.9. В случае, если Комиссией по приемке НИОКР выявлены замечания, препятствующие приемке отчетной документации, либо принято решение о невозможности осуществления приемки результатов работ, эксперт по приемке, в срок, не превышающий 3 (три) рабочих дня с даты проведения заседания Комиссии по приемке НИОКР:

а) формирует Заключение комиссии по результатам рассмотрения отчетной документации по НИОКР с приложением перечня выявленных недостатков и/или необходимых доработок и сроком их устранения, либо мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ по Договору (отдельному этапу Договора), подписанное членами Комиссии, участвовавшими в заседании, и утвержденное Председателем Комиссии (в случае его отсутствия - заместителем председателя) и направляет через отдел документационного обеспечения сопроводительным письмом в адрес исполнителя;

б) формирует и направляет служебной запиской в адрес дирекции правового обеспечения, договорной работы и имущественных отношений комплект следующих документов:

копию письма, направленного исполнителю с приложением Заключения комиссии по результатам рассмотрения отчетной документации по НИОКР с приложением перечня выявленных недостатков и/или необходимых доработок и сроком их устранения, либо мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ по Договору (отдельному этапу Договора), подписанного членами Комиссии, участвовавшими в заседании, и утвержденного председателем Комиссии (в случае его отсутствия - заместителем председателя);

экспертное заключение, подписанное экспертом по приемке;
копию титульного листа представленной отчетной документации;
иные документы, при наличии.

5.5.10. В случае отсутствия нарушений требований договора, препятствующих приемке выполненных работ, эксперт по приемке в срок, не превышающий 3 (три) рабочих дня с даты проведения заседания Комиссии по приемке НИОКР:

а) организует визирование предварительно проверенных договорным отделом оригиналов актов выполненных работ лично, у руководителя подразделения, директора подразделения по направлению деятельности, в соответствии с положениями [2.6];

б) формирует и направляет служебной запиской в адрес дирекции правового обеспечения, договорной работы и имущественных отношений комплект следующих документов:

Заключение комиссии по результатам рассмотрения отчетной документации по НИОКР, подписанное членами Комиссии, участвовавшими в заседании, и утвержденное председателем Комиссии (в случае его отсутствия - заместителем председателя);

экспертное заключение, подписанное экспертом по приемке;

копия титульного листа представленной отчетной документации;

акты сдачи-приемки выполненных работ (при наличии), завизированные ответственными должностными лицами, в соответствии с положениями [2.6];

акты приема-передачи исключительных прав (при наличии);

иные документы, при наличии.

в) передает служебной запиской в адрес главной бухгалтерии копию Заключения комиссии по результатам рассмотрения отчетной документации по НИОКР (с целью своевременного и правильного отражения в бухгалтерской отчетности результатов внедрения выполненных НИОКР), подписанного членами Комиссии, участвовавшими в заседании, и утвержденного председателем Комиссии (в случае его отсутствия - заместителем председателя);

5.5.11. Организация подписания актов сдачи-приемки выполненных работ производится в соответствии с положениями [2.6]. Размещение в ЕИС подписанных документов об исполнении договора производится в соответствии с положениями [2.6] и [2.9].

5.5.12. В случае непредставления исполнителем отчетной документации по НИОКР в сроки, установленные договором, эксперт по приемке инициирует претензионно-исковую работу согласно положениям [2.7], направляя соответствующую служебную записку в адрес дирекции правового обеспечения, договорной работы и имущественных отношений.

5.5.13. Блок-схема контроля выполнения и организация приемки результатов НИОКР приведена в Приложении Е к настоящему Стандарту.

### 5.6. Внедрение, организация учета и хранения полученных результатов НИОКР

На шестом этапе процедуры реализации НИОКР для нужд ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» проводится внедрение, организация учета и хранения полученных результатов НИОКР в следующем порядке:

5.6.1. При осуществлении приемки результатов последнего (либо единственного, если работа выполняется в один этап) этапа НИОКР Комиссией вырабатываются рекомендации по внедрению результатов НИОКР, включающие комплекс мероприятий, предусматривающих практическое использование научных результатов, а также принимаются следующие решения:

о передаче отчетных документов в структурное подразделение, в компетенцию которого входит внедрение полученных результатов НИОКР;

о дате начала и сроке использования результатов НИОКР;

о необходимости правовой охраны и/или регистрации результатов НИОКР.

5.6.2. Решение о дальнейшем использовании опытных образцов, полученных в ходе проведения НИОКР, принимается Комиссией по приемке НИОКР, с учетом положений ГОСТ Р 15.301-2016.

5.6.3. Эксперт по приемке в срок, не превышающий 10 (десять) рабочих дней с даты подписания заключения Комиссии по приемке НИОКР и на основании решений, принятых Комиссией по приемке НИОКР, формирует служебную записку на имя руководителя структурного подразделения по направлению деятельности за подписью председателя Комиссии (в случае его отсутствия - заместителя председателя) о передаче полученных в ходе проведения НИОКР результатов для их последующего внедрения.

5.6.4. Внедрение результатов НИОКР осуществляется путем практического использования полученных отчетных документов в процессе работы подразделений, в чью функциональную особенность и компетенцию входит применение/внедрение результатов НИОКР.

5.6.5. Эксперт по приемке в срок, не превышающий 10 (десять) рабочих дней с даты подписания заключения Комиссии по приемке НИОКР и на основании решений, принятых Комиссией по приемке НИОКР:

а) формирует и направляет служебной запиской в адрес дирекции правового обеспечения, договорной работы и имущественных отношений предусмотренный законодательством пакет документов для подачи заявки на присвоение прав на результаты интеллектуальной деятельности с письменным обоснованием необходимости регистрации таких прав (при необходимости);

б) формирует и направляет служебной запиской в адрес дирекции правового обеспечения, договорной работы и имущественных отношений предусмотренный законодательством пакет документов для подачи заявки на внесение в Единую государственную систему учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ гражданского назначения с письменным обоснованием необходимости представления таких сведений (при необходимости).

5.6.6. При наличии оснований и необходимого комплекта документов, дирекция правового обеспечения, договорной работы и имущественных отношений организовывает работу по присвоению исключительных прав на результат НИОКР,

выполняемых в рамках договора, а также регистрацию в Единой государственной системе учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ гражданского назначения в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

5.6.7. Эксперт по приемке в срок, не превышающий 20 рабочих дней с даты завершения работ по договору направляет заявку по электронной почте в адрес секретаря НТС с приложением обобщенной документации для размещения в парке Архив НИОКР в электронном виде на ресурсе по адресу https://portal.matfmc.ru/sites/Teams/NIOKR. В пакет документов для размещения должны входить следующие документы:

- копии отчетной документации, подписанные исполнителем, - в формате *pdf;
- копия договора с приложением технического задания, - в формате *pdf;
- копии презентационных материалов, представленных исполнителем на заседании Комиссии по приемке НИОКР, - в формате *pdf / *pptx;
- копия протокола заседания Комиссии по приемке НИОКР, - в формате *pdf;
- иные документы, представленные исполнителем в качестве отчетной документации в процессе заседания Комиссии по приемке НИОКР (доклады, таблицы, рисунки, графики, дополнительные материалы) в формате *pdf/ *xls/ *jpg.

Ответственность за содержание представляемых в адрес секретаря НТС документов несет эксперт по приемке.

Секретарь НТС осуществляет публикацию представленных документов в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их поступления от эксперта по приемке.


5.6.8. Эксперт по приемке формирует в боксы оригиналы отчетной документации в бумажном виде и организовывает хранение в отделе не менее 5 (пяти) лет, а затем сдает в техническую библиотеку ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» для дальнейшего учета и хранения.

5.6.9. Блок-схема внедрения, организации учета и хранения полученных результатов НИОКР приведена в Приложении Ж к настоящему Стандарту.


## 7. История изменения документа

| Номер редакции | Содержание изменений | № и дата приказа |
|---|---|---|
| Редакция 01 | Документ введен впервые | Приказ №659-п от 18.08.2020 |
| Редакция 02 | Внесены изменения нормативные ссылки в связи с упразднением Регламента взаимодействия структурных подразделений при планировании закупок и формирования отчетности в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Порядка подготовки обоснования начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и вводом в действие СТО-ГК-0001-084 «Порядок организации закупочной деятельности ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». | |

**Приложение А (справочное) Блок-схема основных этапов реализации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для нужд ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»**

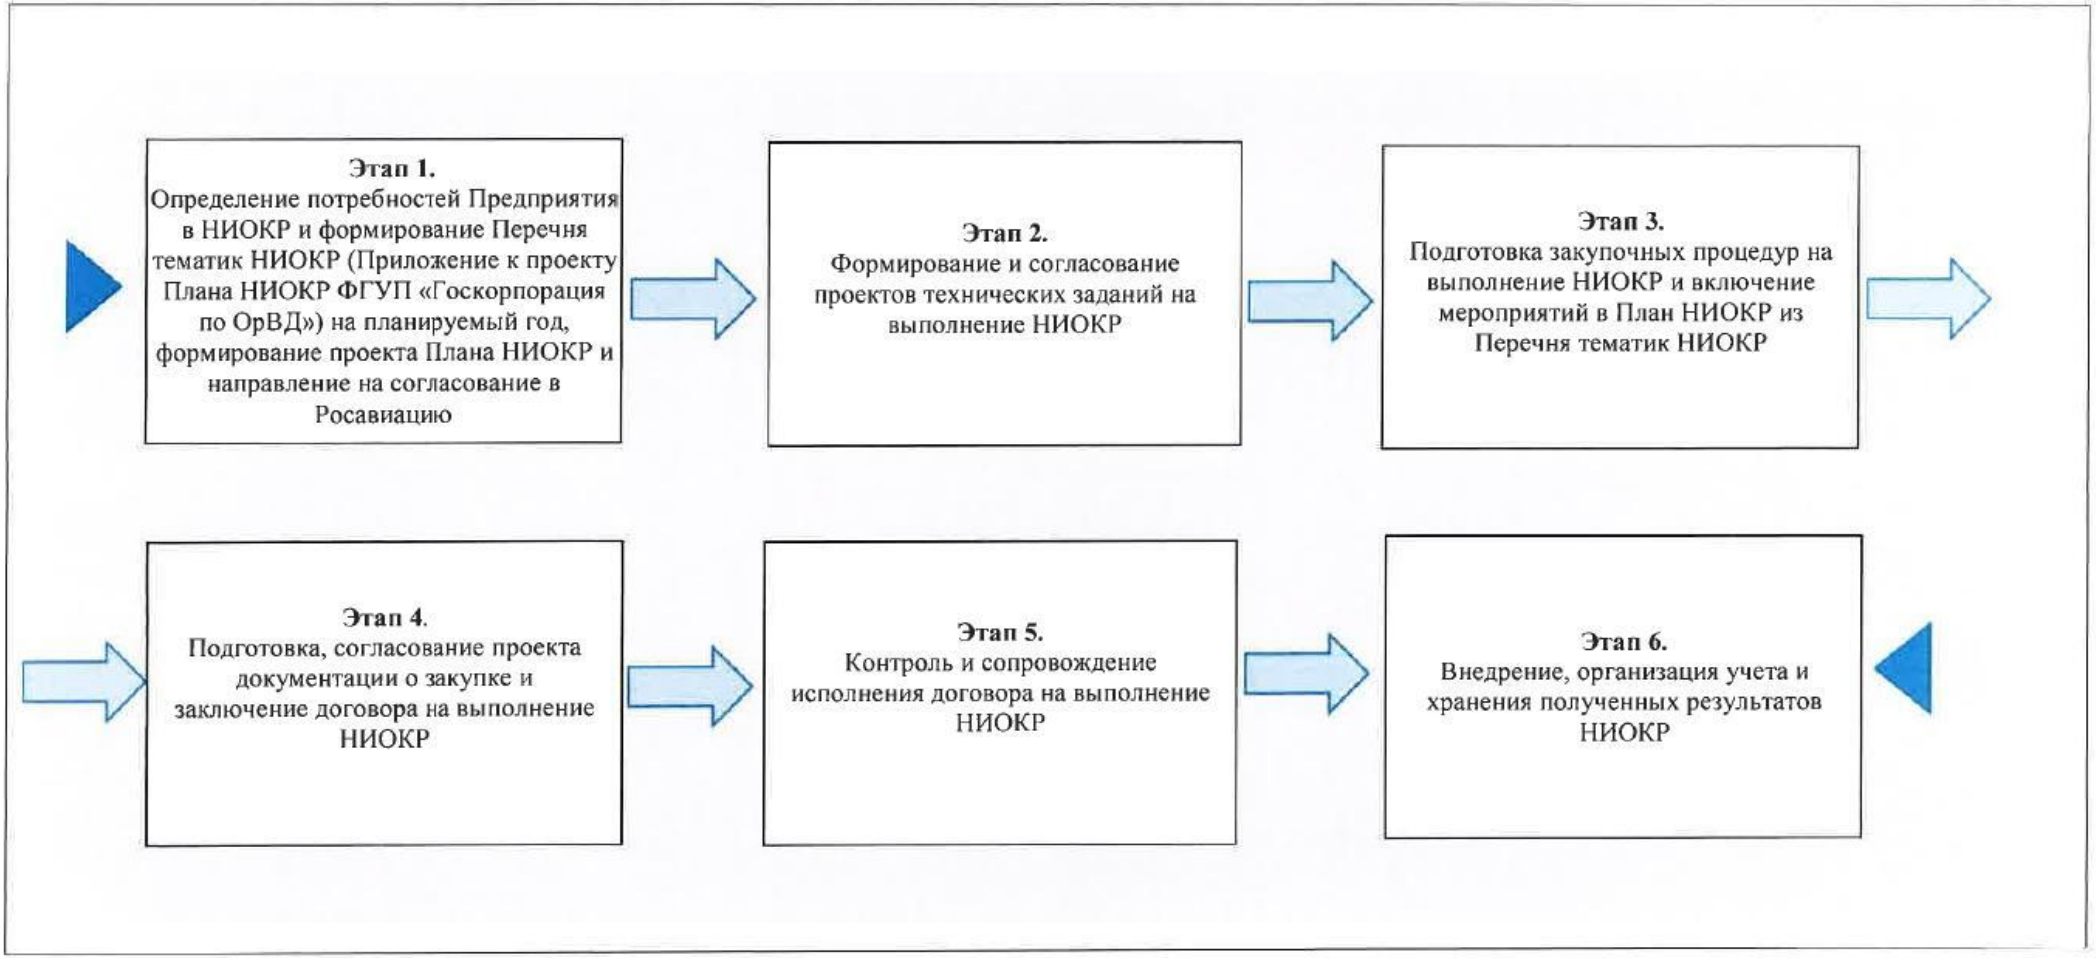


**Приложение Б (справочное) Определение потребностей Предприятия в НИОКР и формирование Перечня тематик НИОКР (Приложение к проекту Плана НИОКР ФГУП «Госкорпорация по ОрВД») на планируемый год, формирование проекта Плана НИОКР и направление на согласование в Росавиацию**

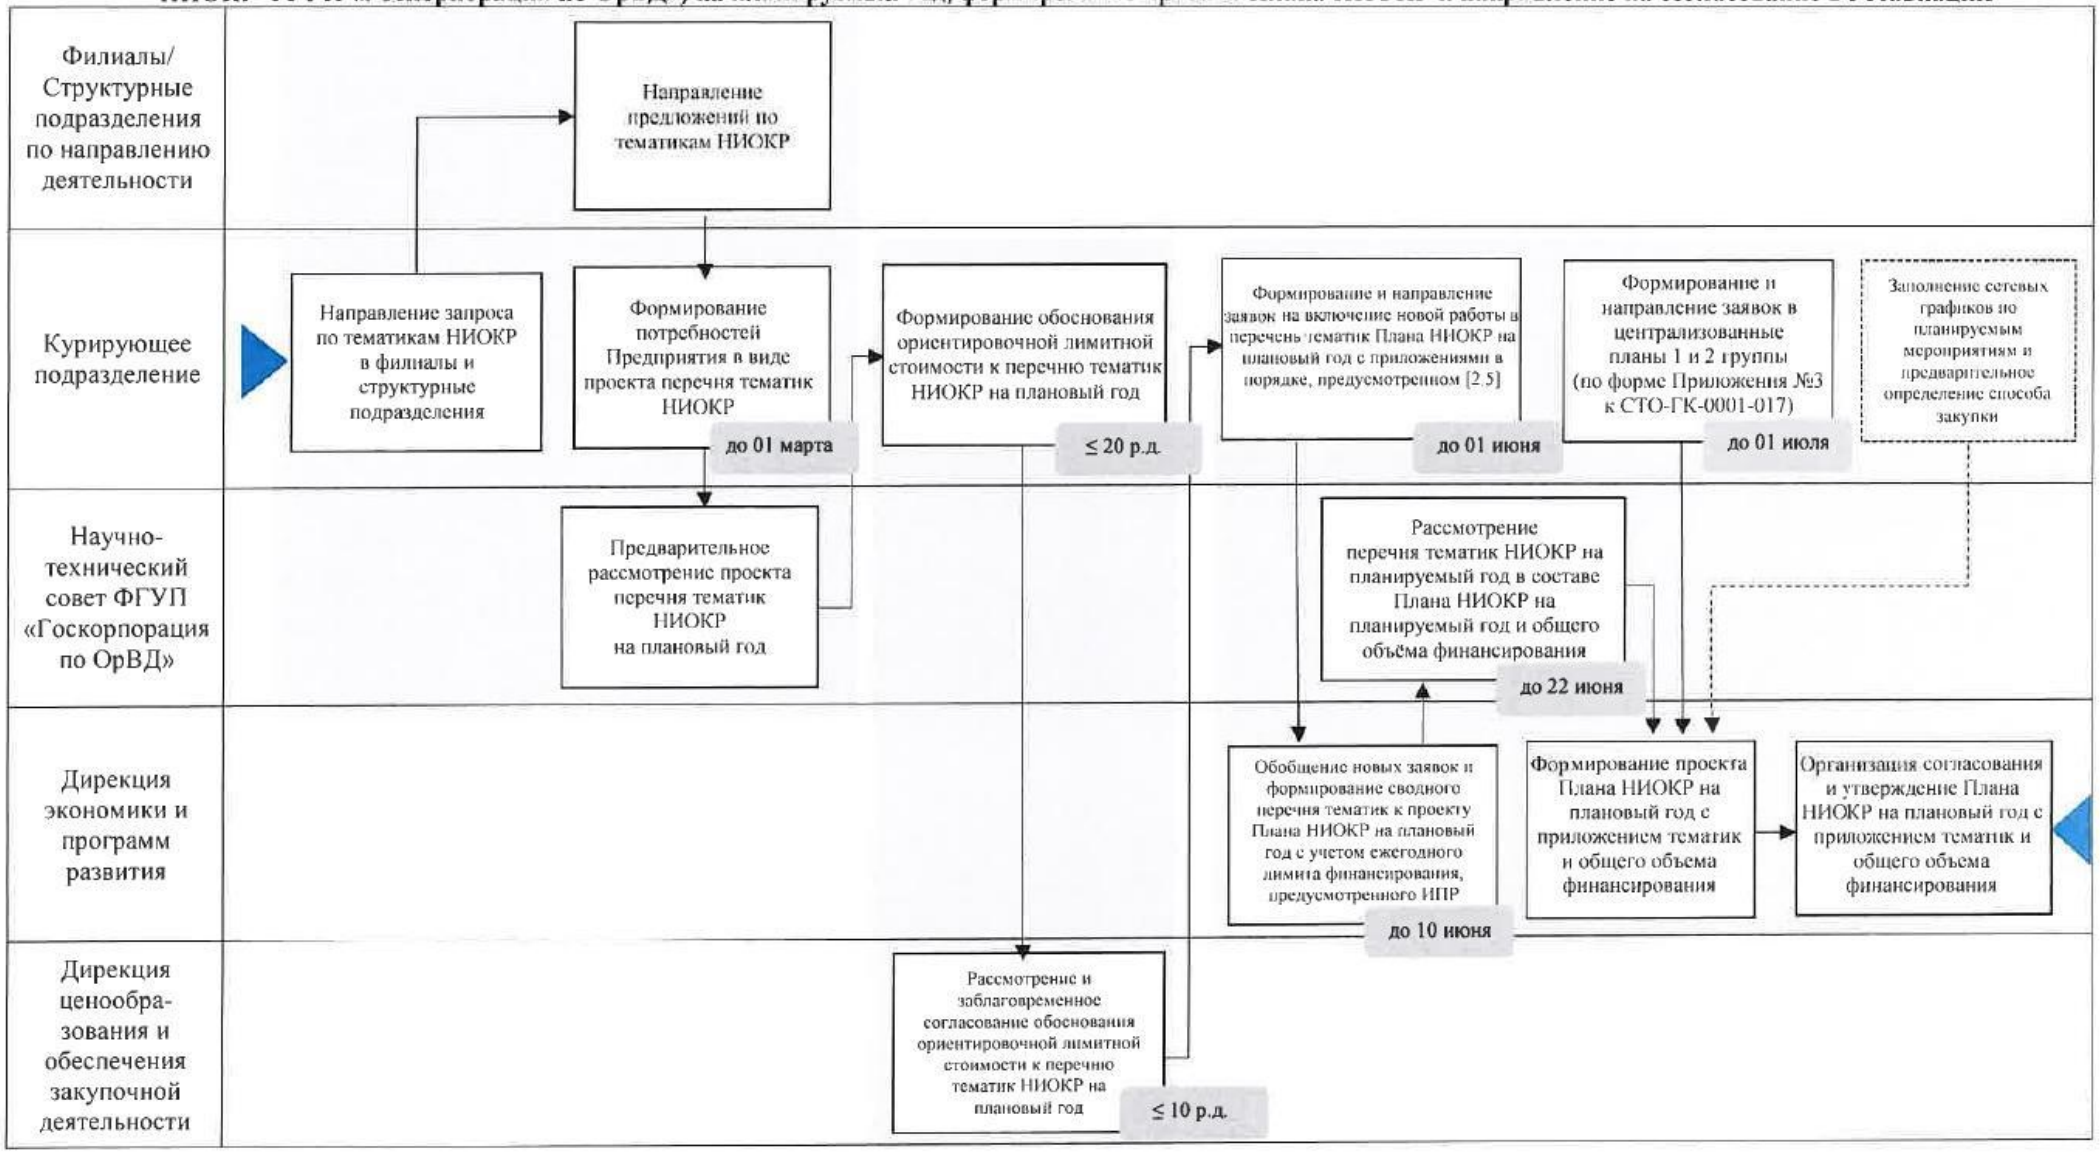



Документ создан в электронной форме. № 573-п от 05.10.2021. Исполнитель Поликарпова А.Н.
Страница 20 из 32. Страница создана: 05.10.2021 11:03

## Приложение В (справочное) Организация разработки проектов технического задания на выполнение НИОКР

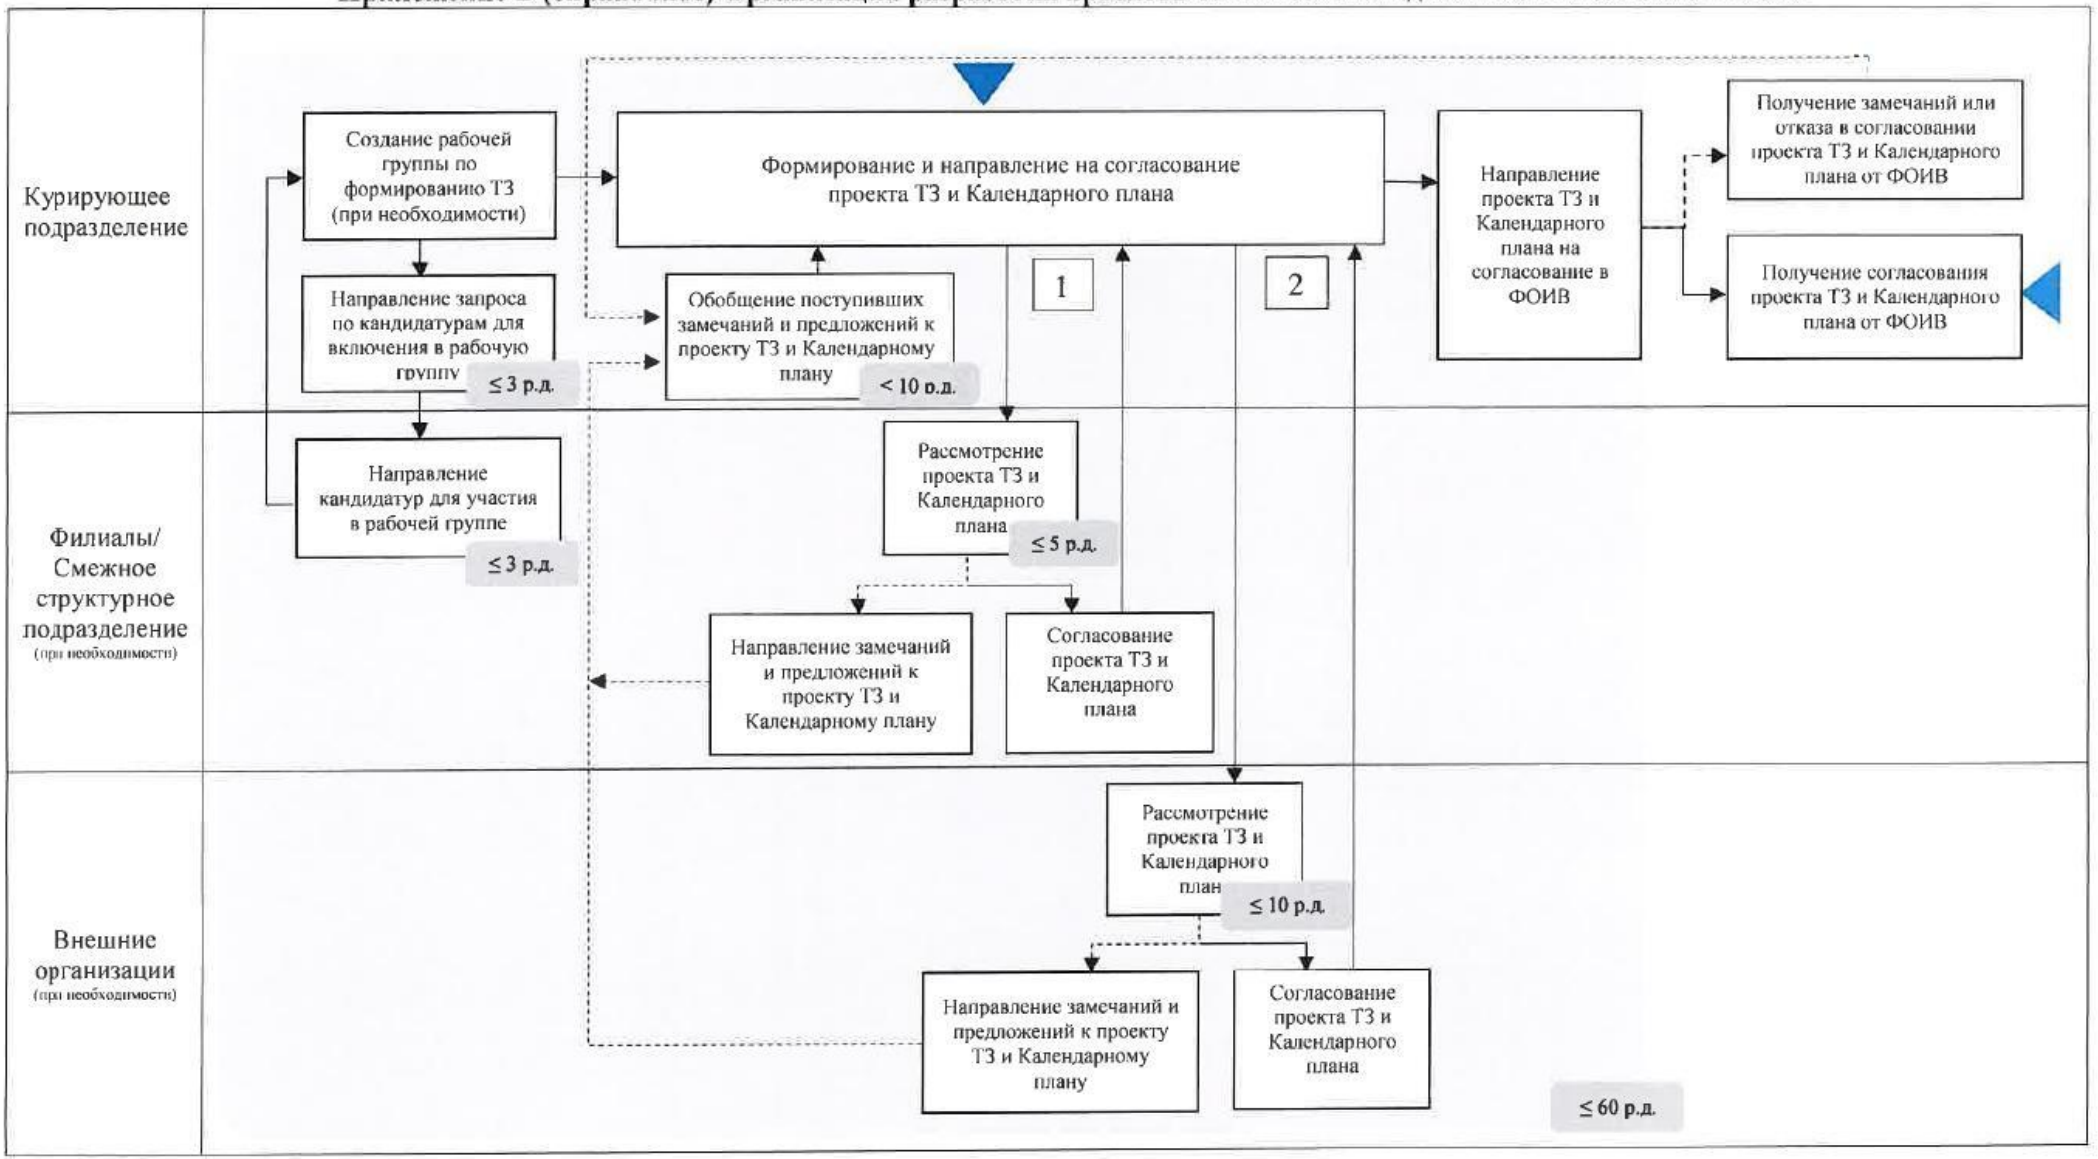



Перед использованием данного СТО проверьте его актуальность, сверив с подлинником СТО в электронном виде в разделе «Регламенты и стандарты» на корпоративном портале

## Приложение Г (справочное) Подготовка закупочных процедур на выполнение НИОКР и включение мероприятий в План НИОКР из Перечня тематик НИОКР (начало)

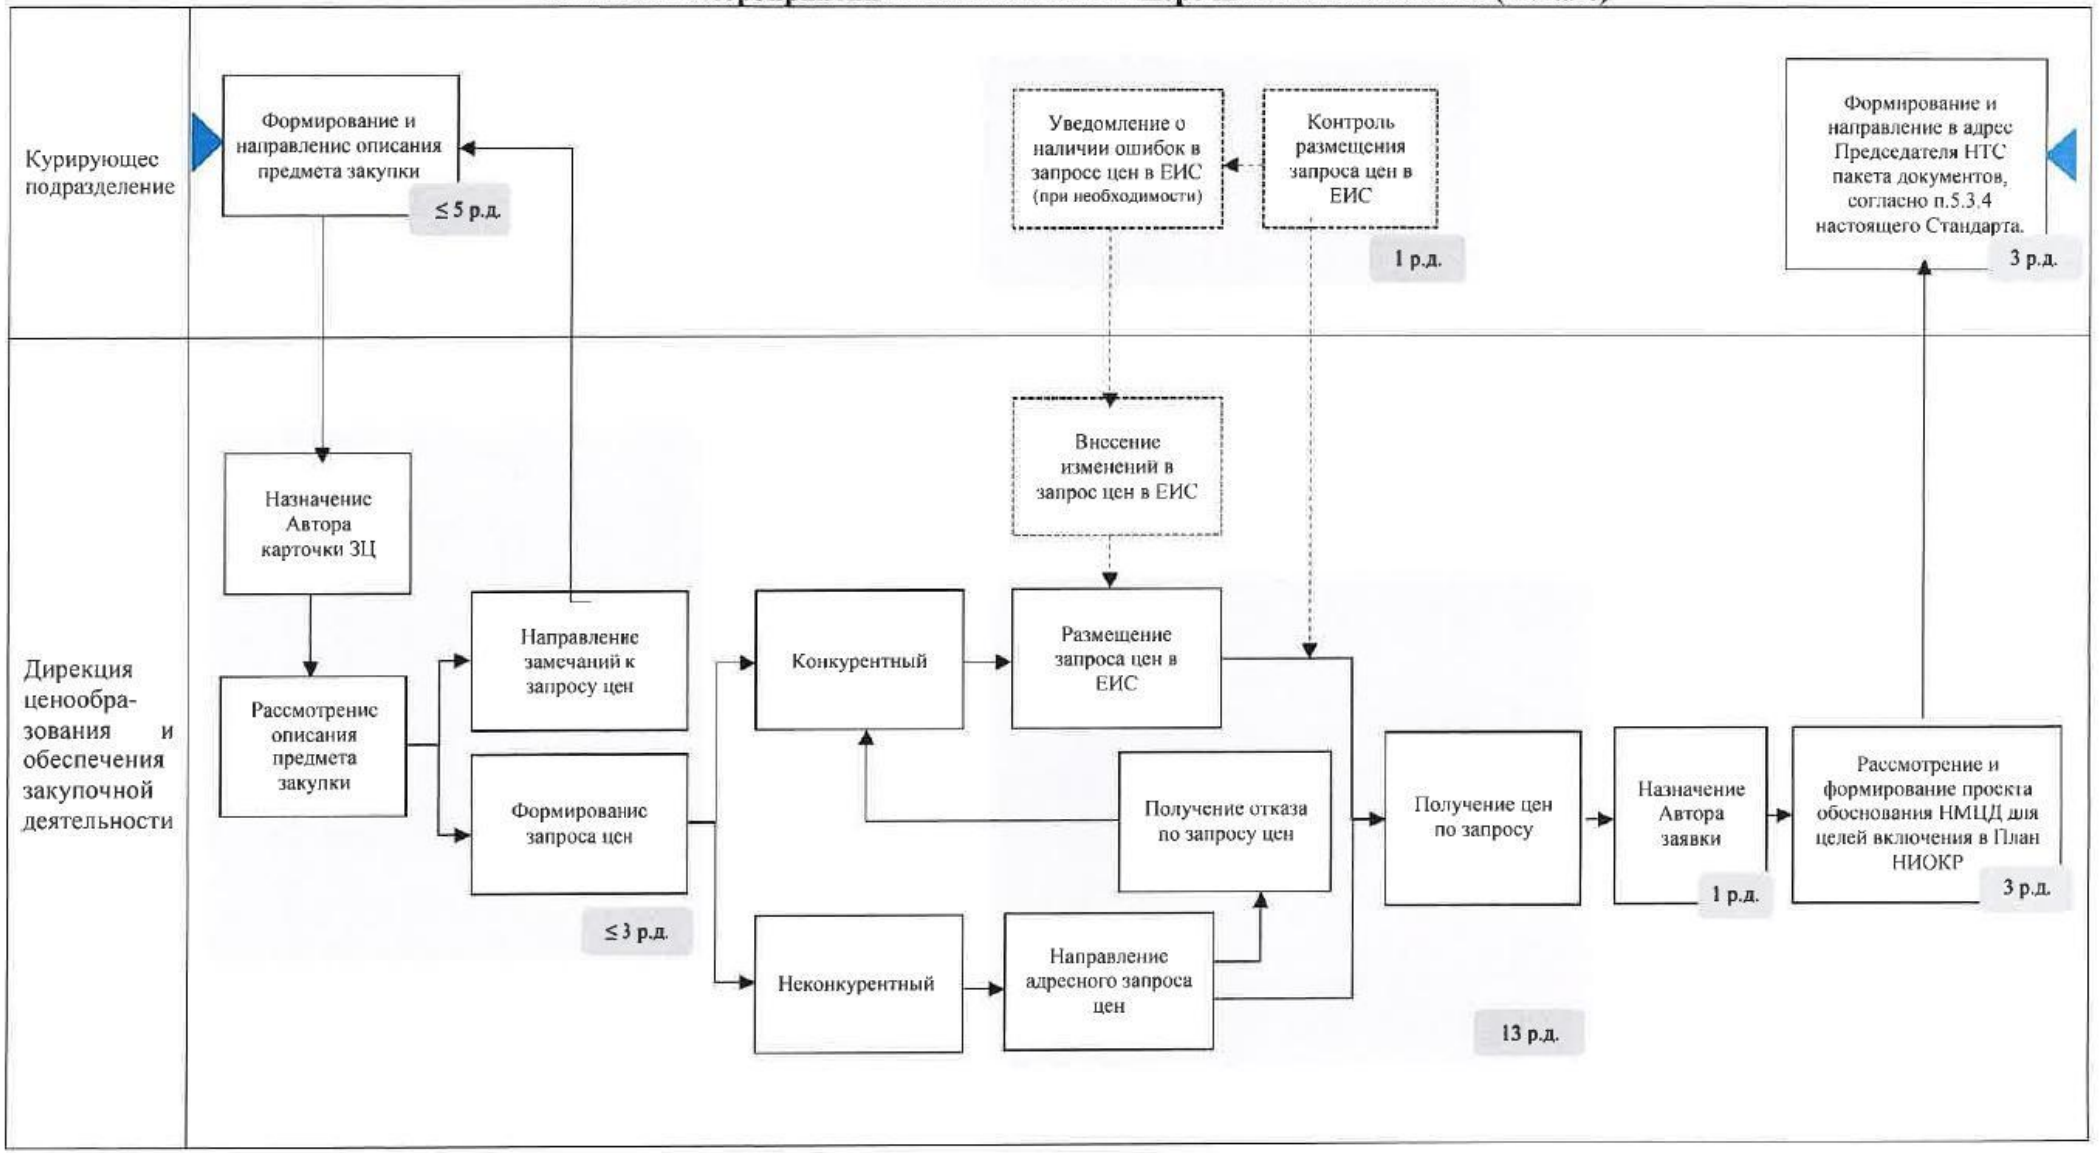



Перед использованием документа СТО проверьте его актуальность, сверив с подлинником СТО в электронном виде в разделе «Регламенты и стандарты» на корпоративном портале

## Приложение Г (справочное). Подготовка закупочных процедур на выполнение НИОКР и включение мероприятий в План НИОКР из Перечня тематик НИОКР (окончание)

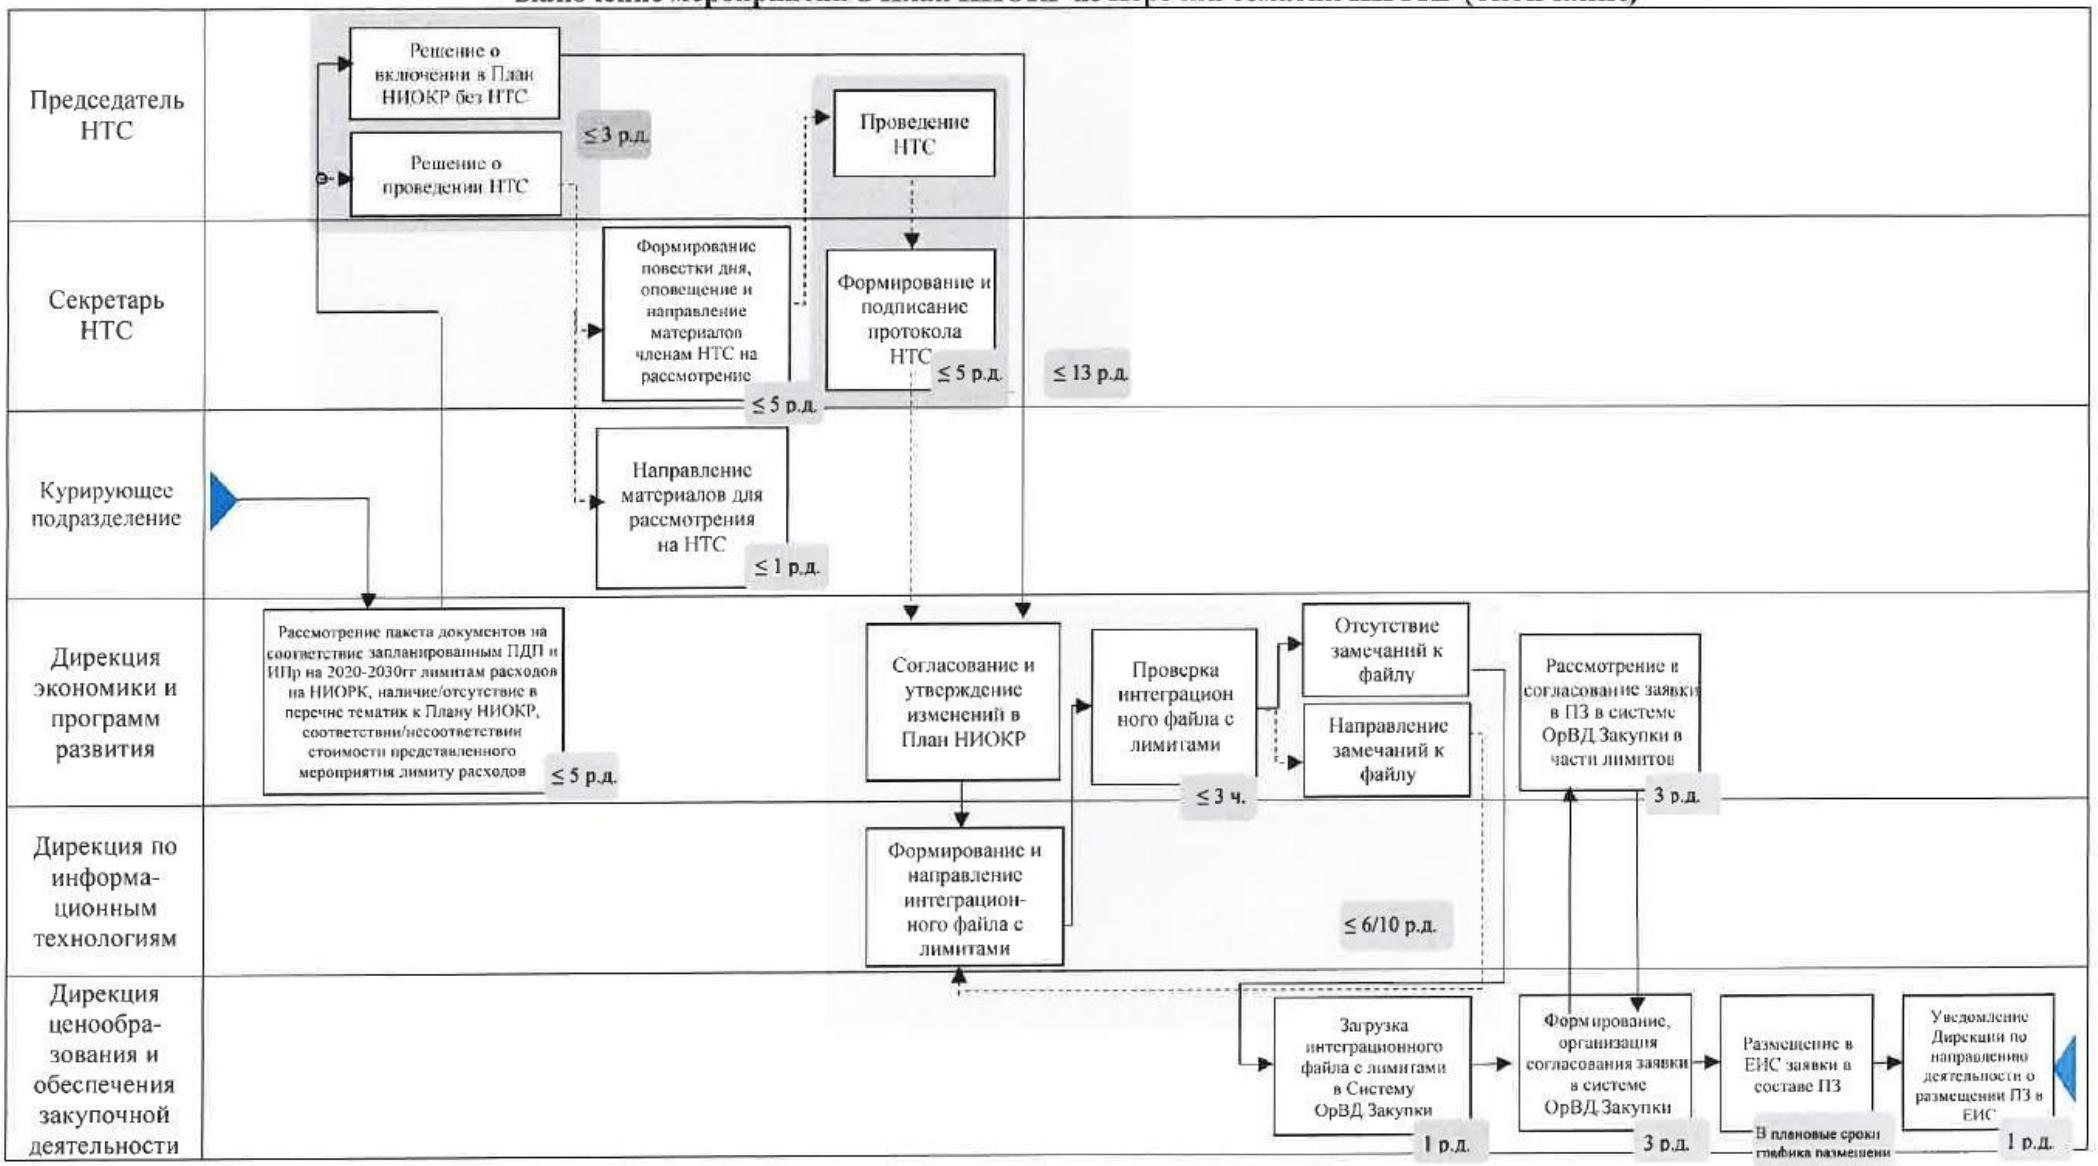



Перед использованием документа проверьте его актуальность, сверив с подлинником СТО в электронном виде в разделе «Регламенты и стандарты» на корпоративном портале

## Приложение Д (справочное). Организация и сопровождение закупочных процедур на выполнение НИОКР (начало)

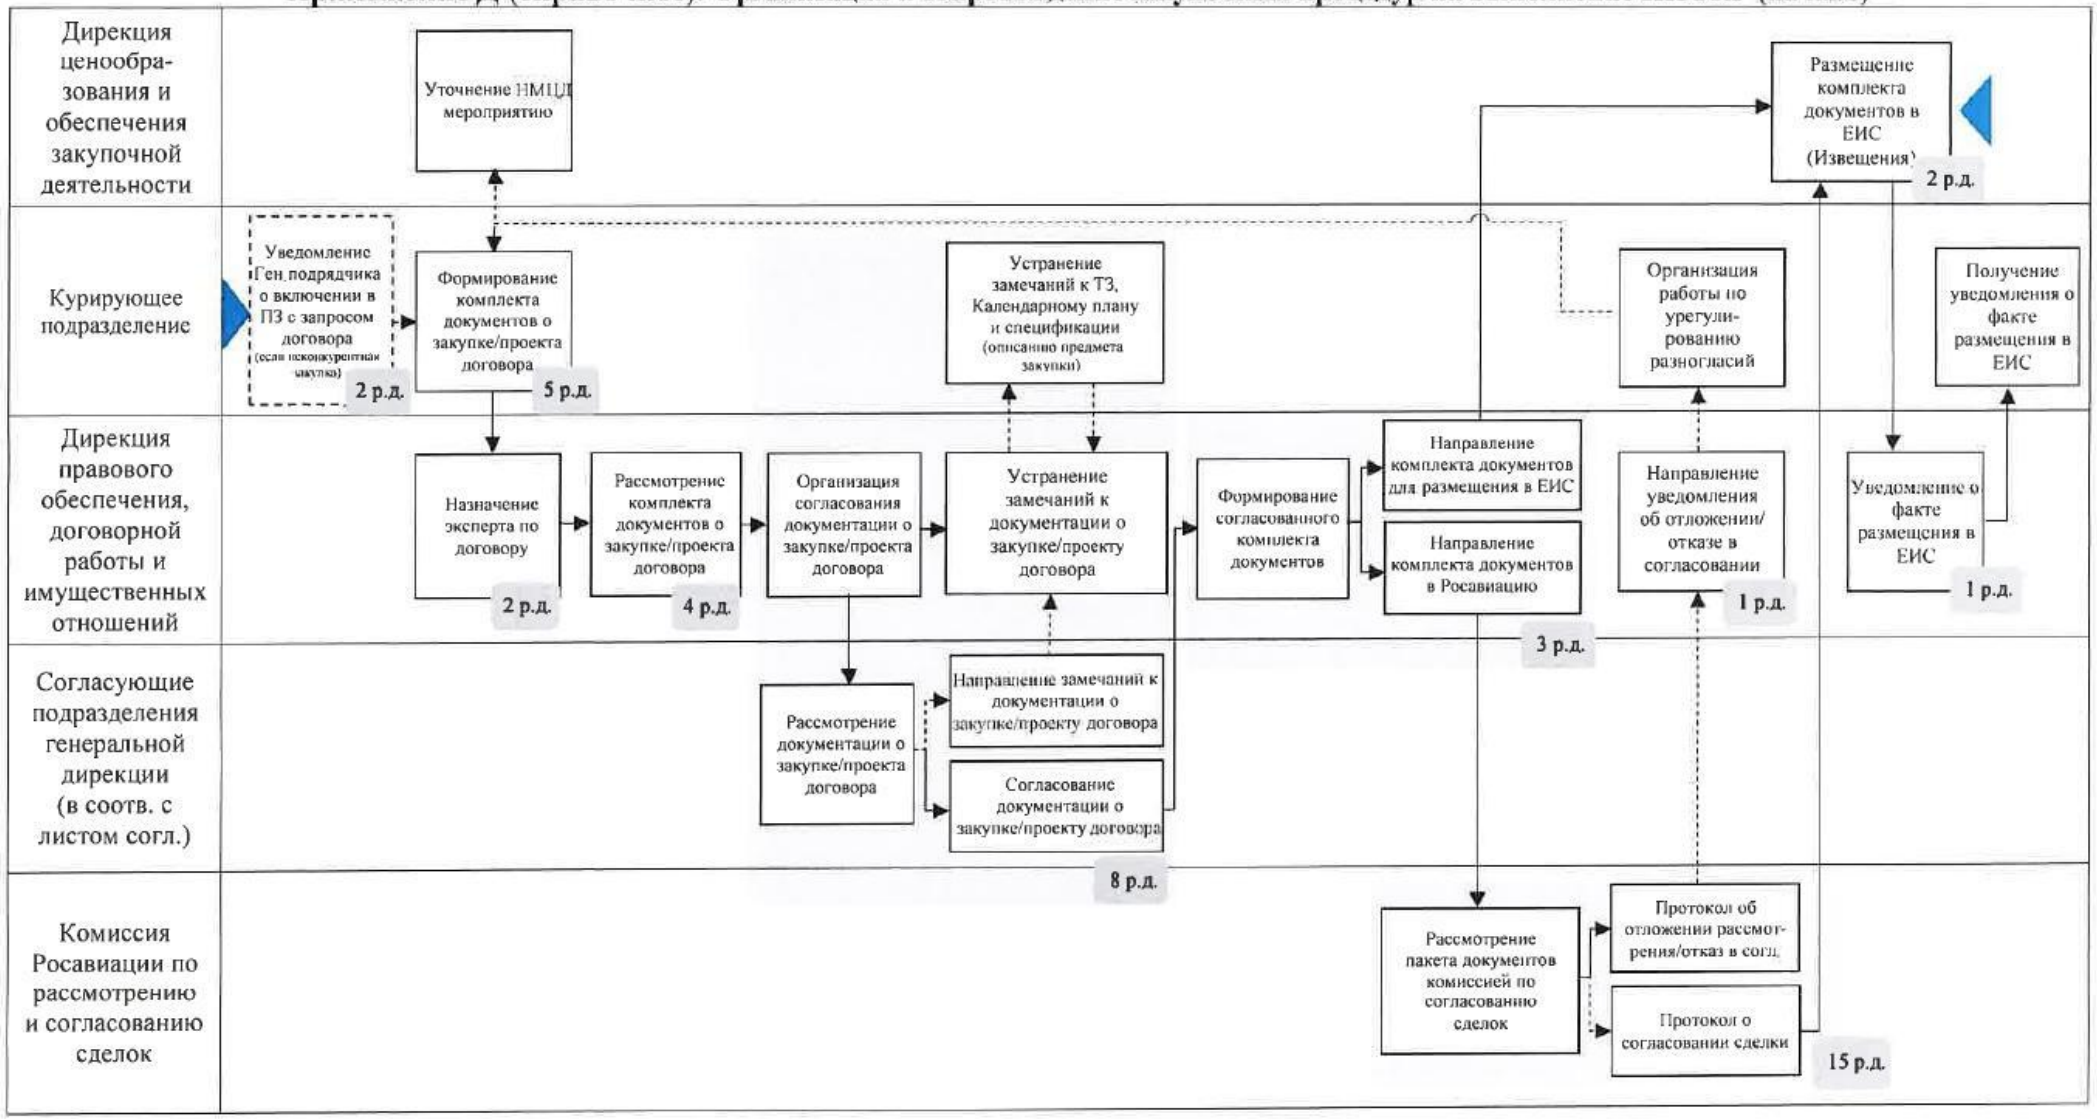


## Приложение Д (справочное). Организация и сопровождение закупочных процедур на выполнение НИОКР (окончание)

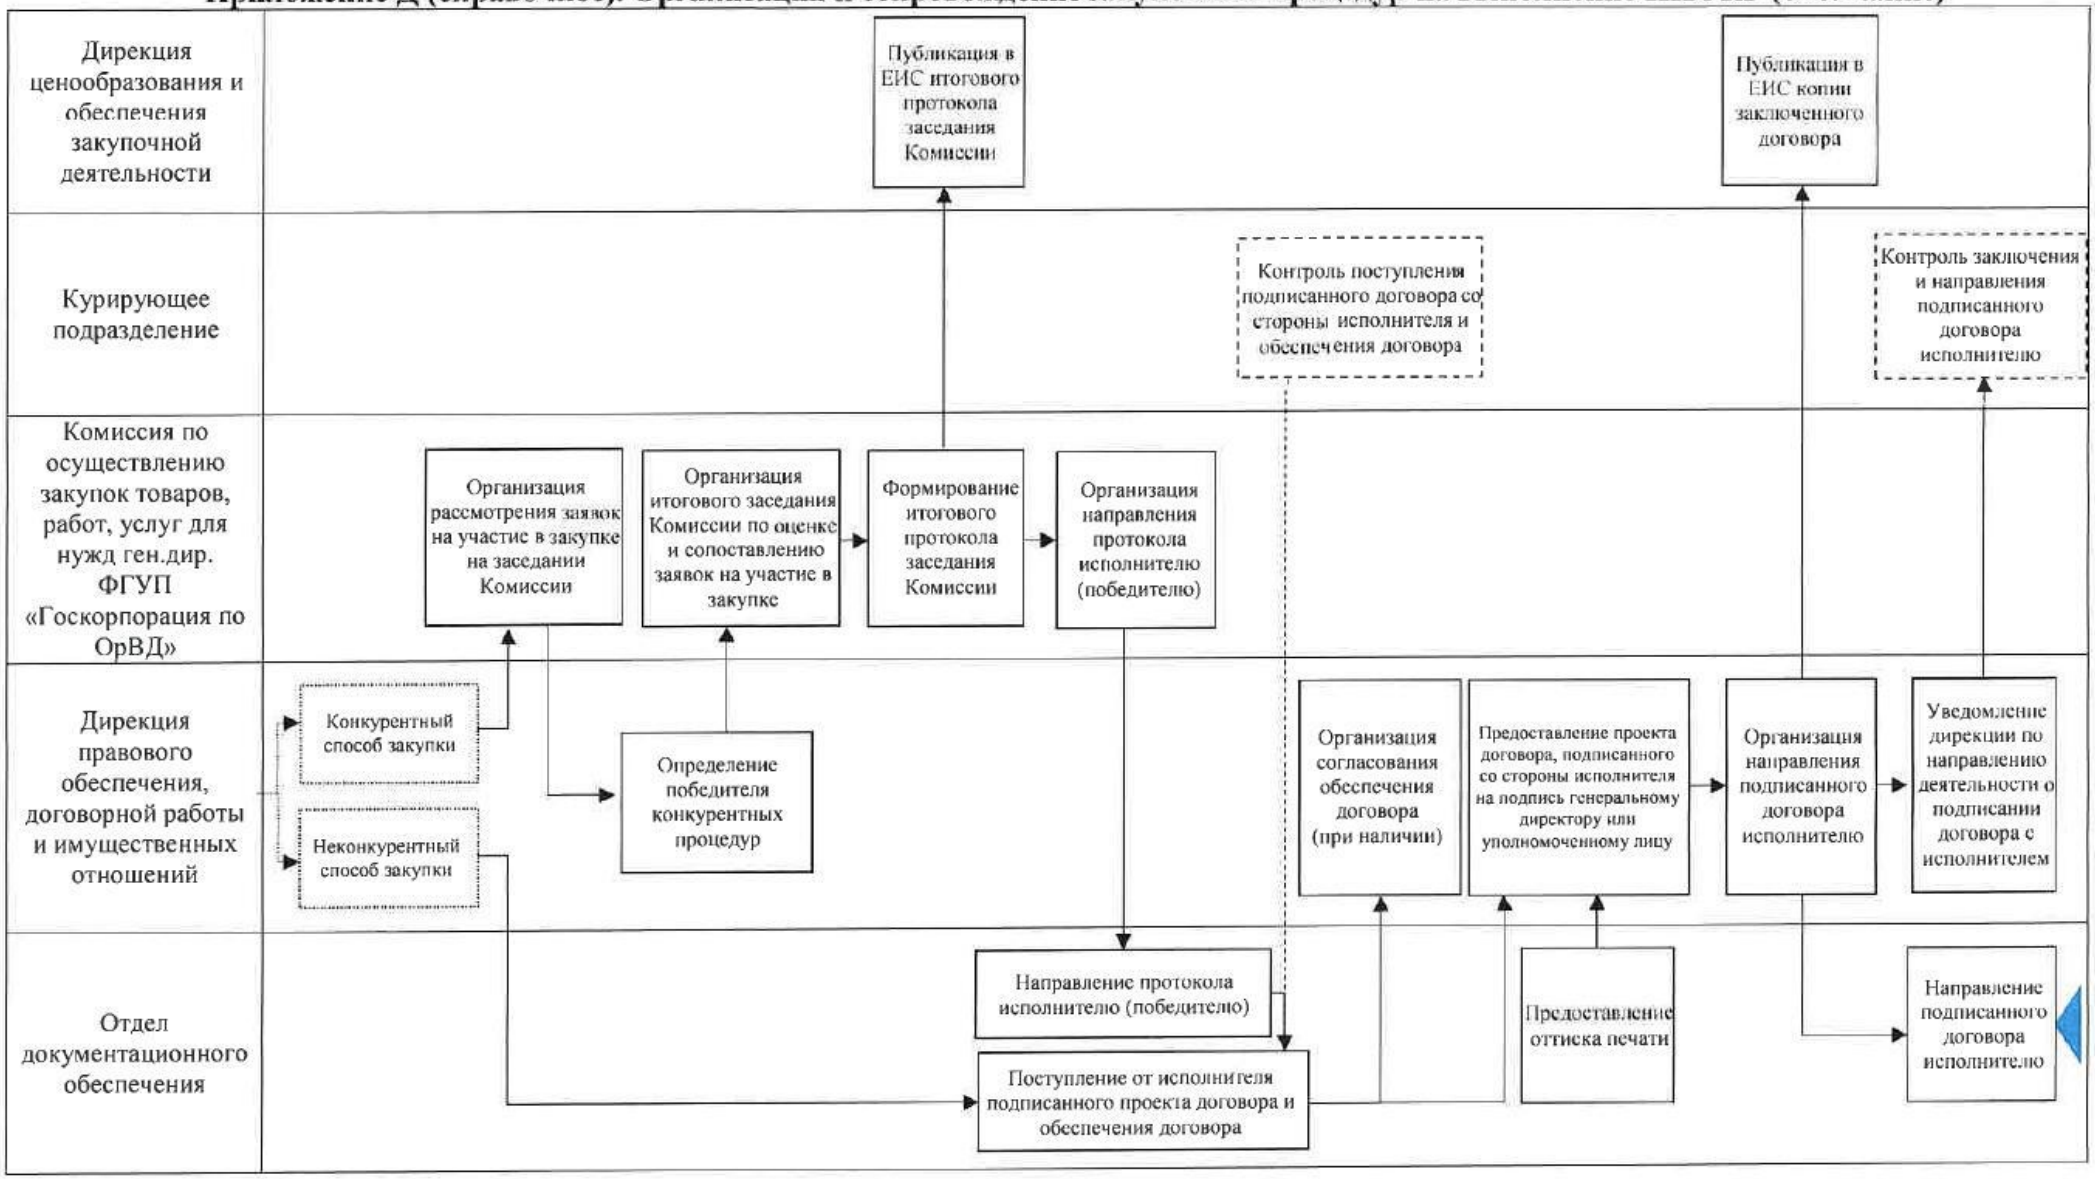


Перед использованием данного СТО проверьте его актуальность, сверив с подлинником СТО в электронном виде в разделе «Регламенты и стандарты» на корпоративном портале


## Приложение Е (справочное). Контроль выполнения и организация приемки результатов

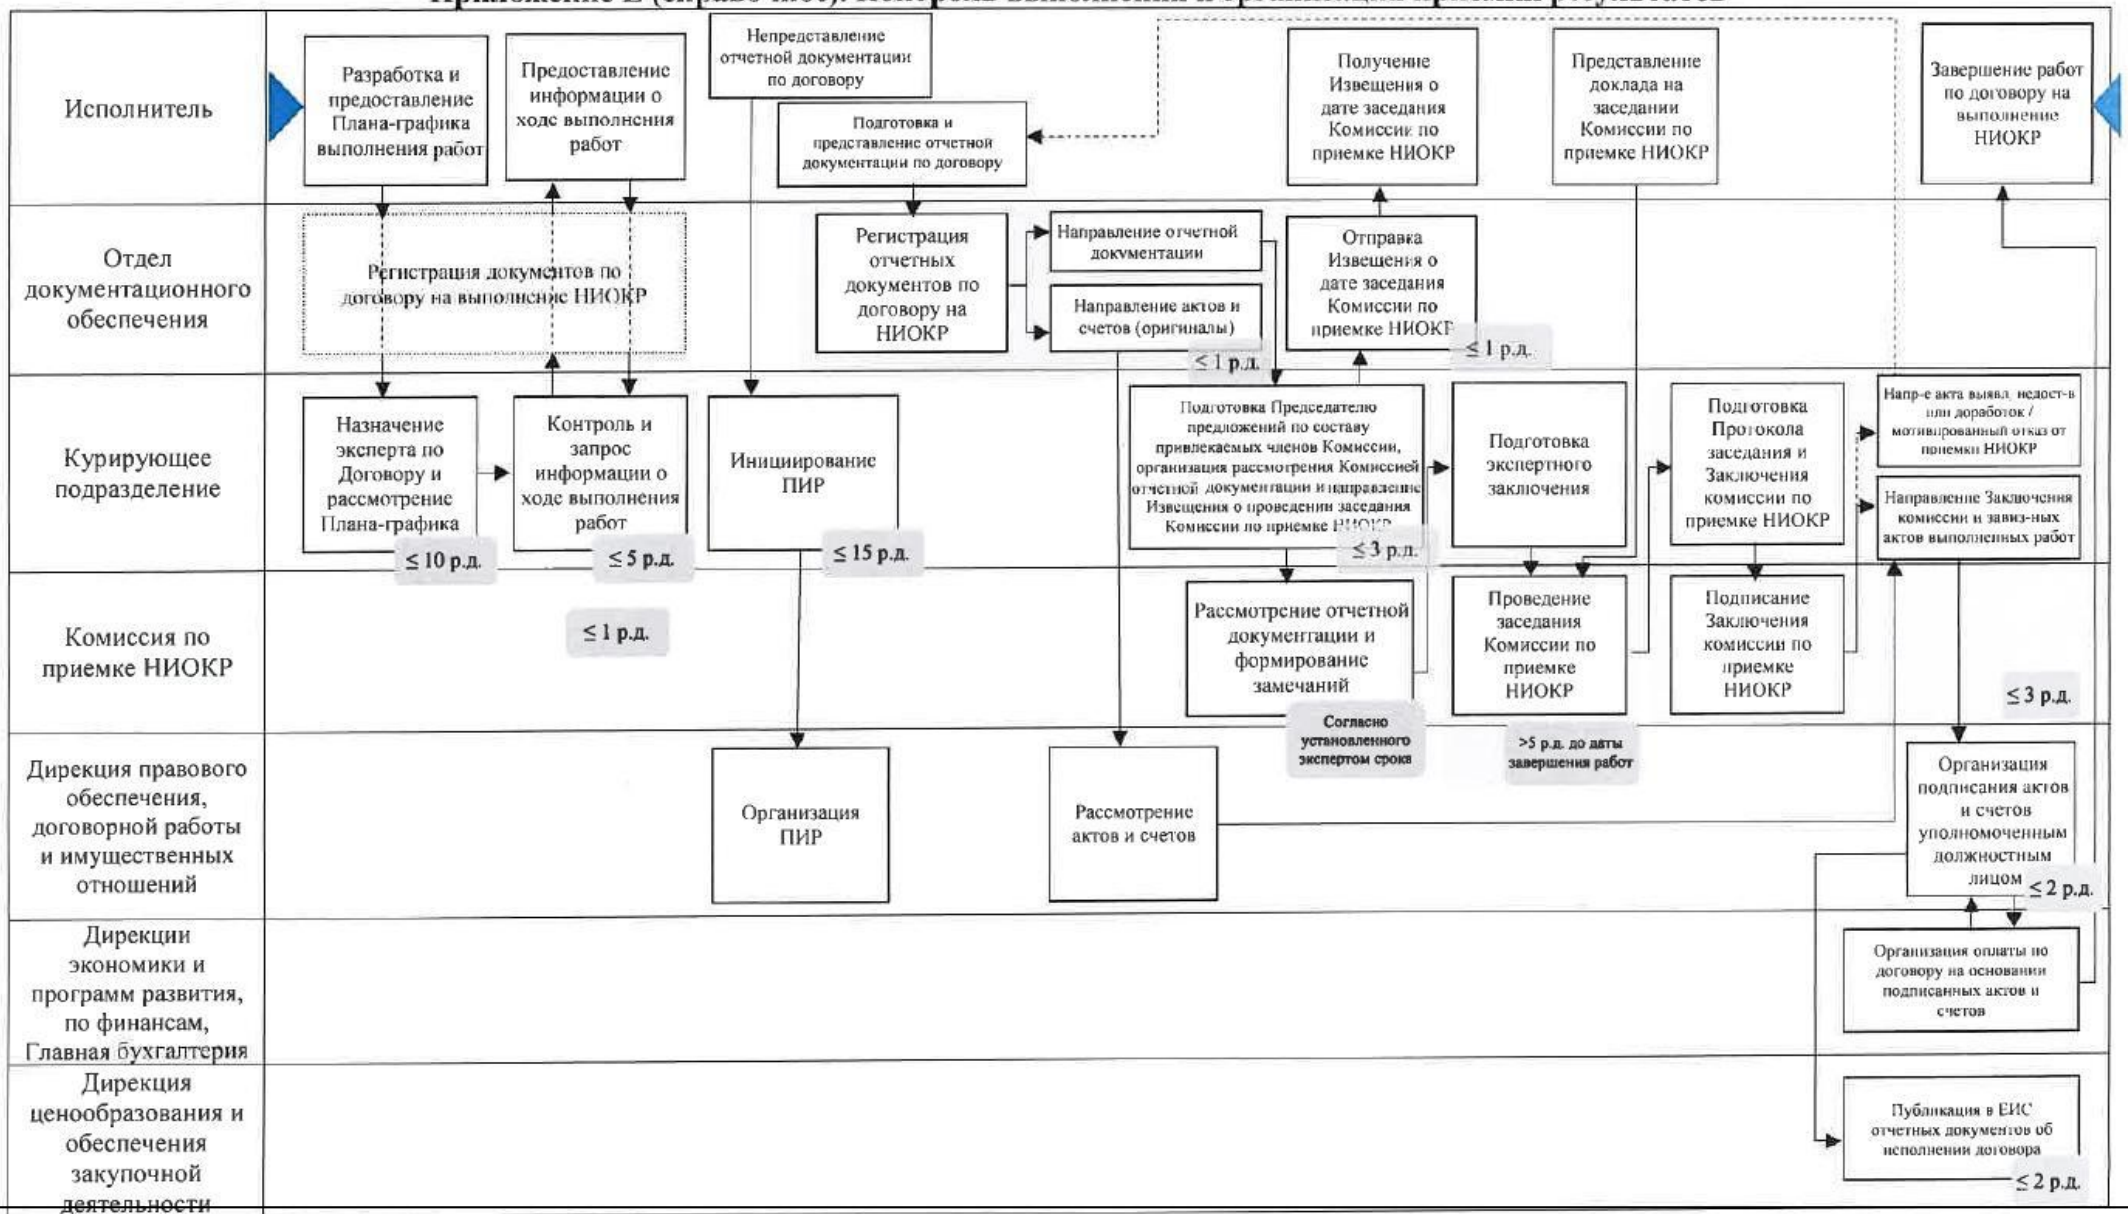



Документ создан в электронной форме. № 573-п от 05.10.2021. Исполнитель: Поликарпова А.Н.
Страница 26 из 32. Страница создана: 05.10.2021 11:03
Перед использованием данного СТО проверьте его актуальность, сверив с подлинником СТО в электронном виде в разделе «Регламенты и стандарты» на корпоративном портале

## Приложение Ж (справочное). Внедрение, организация учета и хранения полученных результатов НИОКР

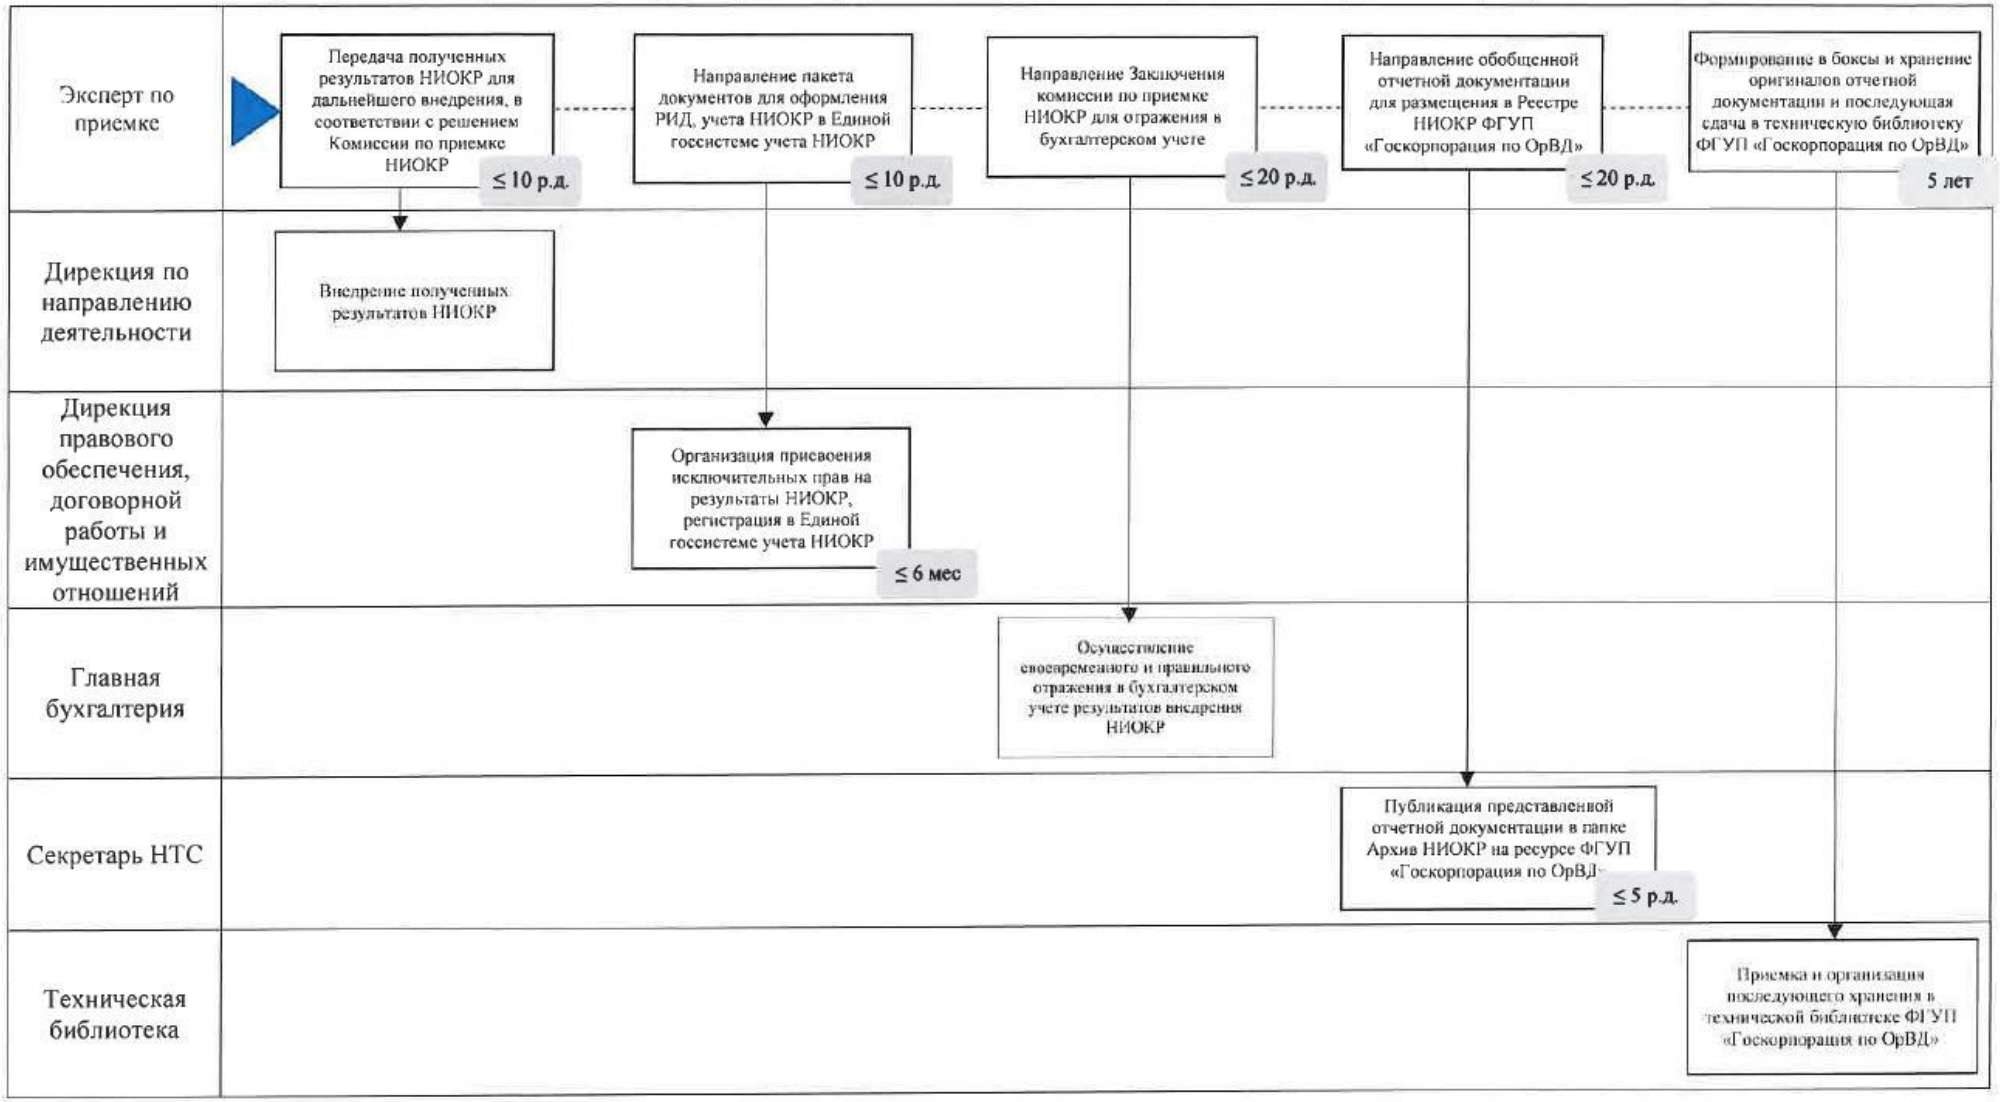



Документ создан в электронной форме. № 573-п от 05.10.2021. Исполнитель: Поликарпова А.Н.
Страница 27 из 32. Страница создана: 05.10.2021 11:03

**Приложение 3 (справочное) Типовая форма проекта технического задания и календарного плана выполнения НИОКР**

**ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ**

на выполнение (научно-исследовательской/ опытно-конструкторской) работы по теме:

«_____»

Шифр: _____*(при наличии)*

## 1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ (ВЫПОЛНЕНИЯ)

*В данном разделе указывается основание для выполнения работы. Например, протокольные поручения, письма и/или решения научно-технических советов Министерства транспорта Российской Федерации, Федерального агентства воздушного транспорта, ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».*

## 2. ЗАКАЗЧИК И ИСПОЛНИТЕЛИ РАБОТЫ

2.1. Заказчик НИОКР: Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» (ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»).

2.2. Исполнитель:

*Исполнителем работы может являться как единственный поставщик, так и определиться по результатам конкурентных процедур.*

## 3. РОЛЬ И МЕСТО ТЕМЫ (РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ) В РЕШЕНИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

### 3.1. Объект работы

*В данном подразделе указывается объект исследования – носитель проблемы, на который направлена исследовательская деятельность.*

### 3.2. Предмет работы

*В данном подразделе указывается предмет исследования – конкретная часть объекта исследования, внутри которой ведется поиск (явления, отдельные из стороны и т.д.)*

### 3.3. Актуальность темы

### 3.4. Научная новизна

### 3.5. Практическая значимость

*В подразделах 3.3-3.5 формулируется конкретная проблема, требующая разрешения в ходе выполнения данной работы, указывается краткая характеристика проблемной ситуации, взаимосвязь с другими проблемами транспортного комплекса.*

*Указывается, проводились ли ранее работы по данной или схожей тематике. Формулировка проблемы должна отражать понимание того, каких знаний не хватает для ее разрешения, какие подходы уже устарели, неэффективны и не могут быть использованы в настоящее время, какие новые (ранее неизвестные или ранее не существовавшие) решения возможны в указанной сфере деятельности, применение каких новых знаний необходимо для достижения практических целей и решения конкретных задач. Кроме того, необходимо*



Документ создан в электронной форме. № 573-п от 05.10.2021. Исполнитель:Поликарпова А.Н.
Страница 28 из 32. Страница создана: 05.10.2021 11:03

*указать сведения, определяющие актуальность выполнения работы именно в данное время и ее приоритет перед другими подобными исследованиями.*

## 4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

4.1. Цель работы

*В данном разделе формулируется и отражается цель работы – разрешение практической проблемы, достижение конкретных научных и (или) научно-технических результатов, указанных в разделе 6 технического задания. Цель работы должна быть достижима и/или измерима.*

4.2. Ключевые задачи работы:

*В данном разделе указываются задачи, определяющие выбор путей и средств для достижения цели работы.*

## 5. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ И ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЮ

**5.1. Содержание работ:**

НИР/ОКР на тему: «…» выполняется в __ этап(ов).

Сроки выполнения работ (этапов работ) определяются Календарным планом.

5.1.1. В процессе выполнения работы необходимо:

- …
- …

*В случае выполнения работы в несколько этапов, указывается содержание работы по каждому этапу с предоставлением полного перечня их содержания и отчетных документов.*

**5.2. Основные требования к выполнению работы:**

5.2.1. Результаты работы должны соответствовать целям и задачам, изложенным в п.4.1 и п.4.2 настоящего технического задания.

5.2.2. В процессе выполнения работы по мере необходимости проводятся консультации с участием специалистов Заказчика и Исполнителя.

*При выполнении ОКР, указываются дополнительные требования к исполнителю и/или общие технические требования при разработке опытно-конструкторского образца (фрагмента).*

*Примечание: Разделы 5.1. и 5.2. могут быть скорректированы в части наполнения, в зависимости от специфики выполнения каждого из этапов и наличия отчетных документов.*

## 6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

**6.1. Наименование результатов работы**

*В данном подразделе указывается наименование результатов работы, полученных при выполнении работы (и/или этапов работы).*

*В соответствии с положениями статьи 2 Федерального закона от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» научным и (или) научно-техническим результатом является продукт научной и (или) научно-технической деятельности, содержащий новые знания или решения, зафиксированные на любом информационном носителе и предназначенный для реализации.*

**6.2. Предполагаемое использование результатов**

6.1. Сферы деятельности, в которых планируется использовать результат работы:

6.2. Организации, способные внедрить результаты:

6.3. Ожидаемая эффективность работы

*В пунктах 6.1-6.3 указываются государственные нужды, процессы, для которых создаются результаты работы. В случаях, если результат работы направлен на разработку предложений в нормативно-правовые акты, то следует указать, каких именно и/или в каких разделах (пунктах, частях и пр.) нормативных правовых актов планируется использовать данные результаты.*

*В данном разделе также указывается ожидаемая эффективность от внедрения для Аэронавигационной системы Российской Федерации в целом.*

## 7. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

*В данном разделе указываются обязательные для использования источники информации по данной теме и (или) способы ее получения, включая международные (при необходимости).*

*При этом необходимо отметить, что заказчик обязан предоставить исполнителю исходные данные (источники информации), которые указаны в техническом задании.*

| | |
|---|---|
| *Директор по смежному направлению деятельности (при необходимости)* | *Директор курирующего подразделения* |
| _____ *Ф.И.О.* (подпись) | _____ *Ф.И.О.* (подпись) |
| «____» _____ 20__ г. | «____» _____ 20__ г. |

Приложение
к техническому заданию

## КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

**выполнения (*научно-исследовательской / опытно-конструкторской*) работы по теме:**

«_____»

Шифр: _____ *(при наличии)*

| № этапа | Наименование этапа | Отчетные документы | Срок (период) выполнения работы, мес. | Стоимость работ, в т.ч. НДС (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **Итого:** | | | | |

Примечание:
X - дата заключения Договора
Общий срок выполнения работ ___ месяцев с даты подписания Договора.
Возможно досрочное завершение работы.

*Директор по смежному направлению деятельности (при необходимости)*

_____ *Ф.И.О.*
(подпись)
«____» _____ 20__ г.

*Директор курирующего подразделения*

_____ *Ф.И.О.*
(подпись)
«____» _____ 20__ г.

## Лист рассылки СТО

| № п/п | Отличительный индекс подразделения (дирекция, управление, отдел) | Наименование подразделения |
|---|---|---|
| 1 | 0101 | Генеральная дирекция |
